IT予算移管 ガイドライン

IT部門 各チーム向け

2026年11月　予算移管事務局

本書の位置付け

本書は「IT部門向け予算ガイドライン」の下位にあたる、IT予算移管の実務のガイドライン。上位の定めが優先する

全社予算策定ガイドライン
全社

予算策定の全社の決まり。IT予算の移管はここで決定済み

IT部門向け予算ガイドライン
IT部門

IT部門の予算の考え方と運用

本書：IT予算移管ガイドライン
IT部門の各チーム

予算移管の方針と進め方、役割分担の雛形。方針以外は、ビジネス部門と合意して決める

本書を使うときの決まり

- 本書と上位のガイドラインに齟齬がある場合は、上位の定めに従う
- GxP 対象の業務は、品質保証部門が定める SOP・手順が正となる。本書の役割分担は雛形として使う
- 本書の下には、憲章（運用の基準）、手順書（ Runbook）と予算移管シートを置く。合意した内容は合意文書に残す

本書で扱うこと

本書は、予算移管を進めるうえで各チームが押さえる 3つのことを扱う

1

今期の目標と達成状態を理解する

12月末までに移管の稟議が承認されている状態と、そこに至る進め方

第1章

2

移管後の役割の変更

直接業務・IT関連業務・間接業務の分担と、RACI による役割の合意

第2章

3

IT資産管理

固定資産と償却費の持ち方（型A を標準とし、型B は個別に選ぶ）

第3章

第4章では、相談の流れと連絡先・情報共有の方法を示す

第1章　予算移管の方針と進め方

最初にお答えしたいこと／ 今期の目標 ／ 11月〜12月の進め方 ／ 窓口担当の手引き ／ Q&A

最初にお答えしたいこと

懸念 1

**例外はあるのか。
手続きが要る業務まで
1月に移すのか**

例外はない。すべての予算を 2027年1月1日に一括で移す

- 個別移管や案件の保留はしない。移管は全社の方針として決定済み
- 今の担当が SOP・規程・職務分掌など承認済みの文書で定められ、変えるのに正式な手続き（例GxP の変更管理）が要る業務は、手続きが終わるまで今の担当が続ける（経過措置）
- 経過措置があっても予算は移る。その業務と完了予定は合意文書に残す

懸念 2

**移管の後、
誰が何を担うのか。
部門の権限は
どうなるのか**

最終責任（A）は部門に残る。役割分担は標準　RACI を基に合意する

- 間接業務（予算の管理、契約、発注・検収・支払い）は月から IT部門が担う
- 直接業務とIT関連業務のＡはプロセスオーナーに残る。IT部門はＡを引き取らない
- 案件ごとに協議するのは、IT関連業務のＲの分担（部門とSO がどこまでを担うか）と、SO がＲを担い始める時期だけ。移管元の責任者が合意文書を承認して確定する（1～15枚目）

今期の目標

移管の稟議が、12月末までに承認されること

今期は12月末の移管の承認を目指す。移管による効果の創出は、来期に改めて検討する

決まっていること

全社の方針として決定済み

- 経営で決定済み。全社向けの予算策定ガイドラインに明記されている
- 対象は営業部門以外の部門（人事・総務・財務を含む）。各部門には案内済み
- 範囲は、業務アプリケーションとその関連ツールの予算・契約・間接業務
- インフラやセキュリティなど、全社横断の領域は含まない
- 業務プロセスの最終責任は部門に残る

すべて一括で移管する

予算は 2027年1月1日に移る

- 移すかどうかは判断しない
- **一括移管：2027年1月1日（すべての予算）**
- 経過措置：今の役割分担（Before）が SOP・規程・職務分掌など承認済みの文書や記録で定められ、変えるのに正式な手続き（例：GxP の変更管理）が要る業務は、手続きが終わるまで今の担当が続ける
- **経過措置があっても、予算は1月1日に移る**
- 経過措置の業務と完了予定は、合意文書に残す

12月末のゴール

稟議の承認。すべて終わっていなくてよい

前提はこの 3つだけ

① 稟議に必要な情報（移管判定、来年度予算、合意文書）が整理されている


② 終わっていないこと（SOPの改訂、契約の署名者の変更など）が案件ごとに明確になっている

③ 1月から契約の管理と支払いを IT部門が始められる

移管の時点で契約の手続きはしない。署名者は次回の更新から IT部門に変わり、請求書の宛名の変更は2月初旬までに相手先に連絡する

来年以降の役割分担は 11～15枚目に参考として示した。今は予算移管に集中してほしい

11月～12月の進め方（目安）

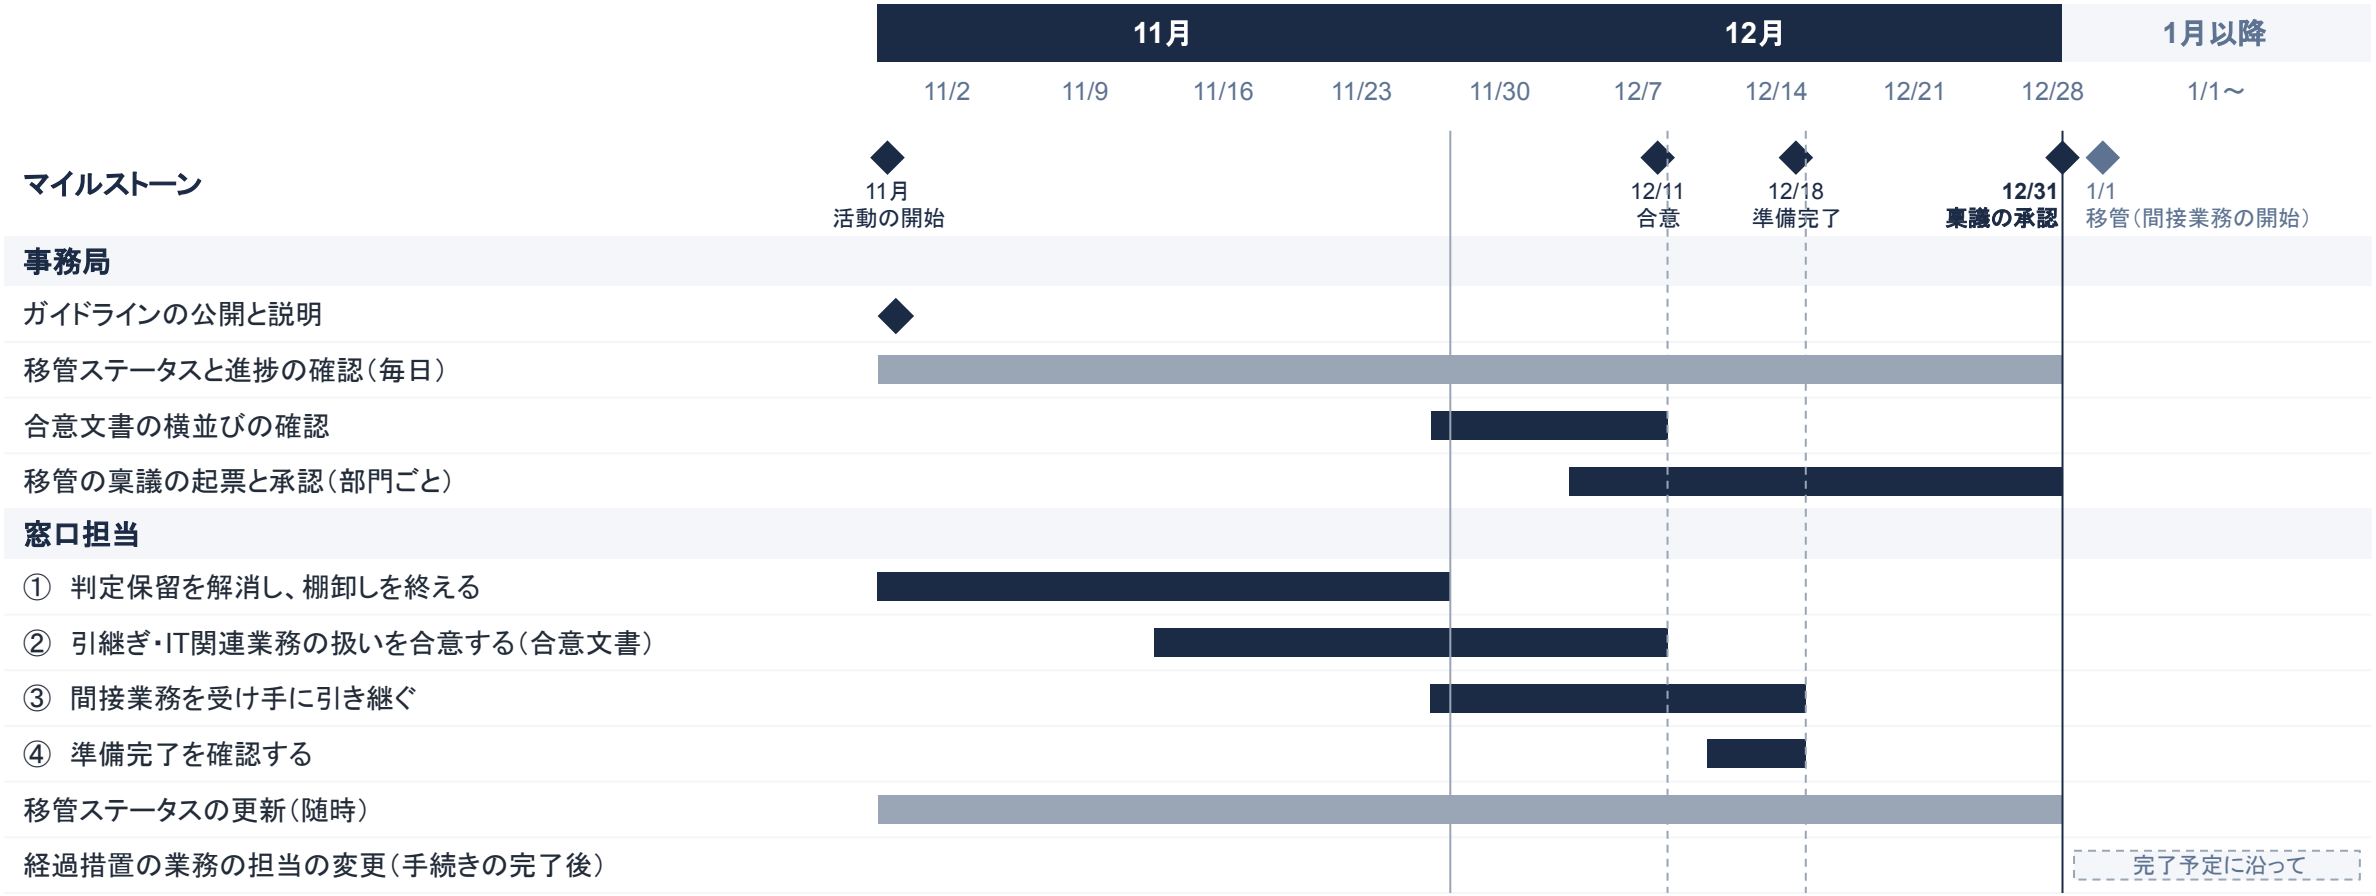

事務局

全体を取りまとめる。移管ステータスを毎日確認し、部門の案件のステータスが埋まったら移管の稟議を起票する。合意文書を横並びで確かめるJT部門長への依頼と相談は事務局が行う

窓口担当（各チーム）

その案件でビジネス部門のカウンターパートを務めている各チームのメンバーが、普段の業務として担う。進め方はビジネス部門と合意して決める§枚目）

窓口担当の手引き

やること（7枚目のタスク①〜④）

1 判定保留を解消し、棚卸しを終える　11月中

記入内容を部門の担当者に確かめ、足りない入力を埋めて判定保留をなくす

成果物　部門の担当者が確認した予算移管シート（予算一覧・紐付け・システム・業務・契約）。判定保留がない状態／ ステータス → 棚卸し済み

2 引継ぎ・IT関連業務の扱いを合意する　12/11まで

RACI（12・13枚目）を案件に合わせてカスタマイズし、経過措置と引継ぎの方法を加えた合意文書を作り、移管元の責任者の承認を得る

成果物　承認された合意文書（カスタマイズしたRACI、経過措置と完了予定、引継ぎの方法。決定記録に登録）／ ステータス → 合意済み

3 間接業務を受け手に引き継ぐ　12/18まで

部門から手順・資料を受け取り、受け手に渡す

成果物　受け手に渡した資料一式（契約書の写し、請求の窓口、支払いの時期、未払いの請求）。担当の変更に手続きが要る業務（GxP など）は、その起票と完了予定

4 準備完了を確認する　12/18まで

準備完了チェックで、合意文書・引継ぎ・経過措置の手続きの起票を確かめる

成果物　準備完了チェックの記録 ／ ステータス → 準備完了

お願いしたいこと

棚卸し中
↓
棚卸し済み
↓
合意済み
↓
準備完了

ほかに「対象外」がある

- 予算移管シートの移管ステータスを、条件を満たしたらその都度更新する
- 「進捗」シートの自分の行（タスクの状態と完了日）を更新する
- 「確認（自動）」欄に表示が出たら、ステータスを見直す（事務局が毎日確認して依頼する）
- 判定は数式で自動。手で書き換えず、直すのは入力
- 承認済みの文書で担当が定められた業務は、経過措置として合意文書に記録する
- 目安に間に合いそうにないときは、理由と見込みを早めに事務局に伝える

Q&A：予算移管の方針と進め方

迷ったら原則に戻る。すべて一括で移し、例外は経過措置だけ

Q　判断に迷う案件は、保留にしてよいか

A　保留にはしない。個別移管と案件の保留は廃止した
担当の変更に手続きが要る業務だけを経過措置とし、予算は1月1日に移す。情報が足りない「判定保留」は 11月中に解消する

Q　今年度から続く投資案件はどうなるか

A　部門に残る。部門は 1回限りの発注・検収だけを行い、次の継続から IT部門が担う

Q　12月末までに、契約の名義変更や　SOP の改訂も終える必要があるか

A　不要。12月末のゴールは稟議の承認
署名者は次回の更新から変わり、請求書の宛名の変更は2月初旬までに連絡する。SOP の改訂は完了予定を合意文書に書けばよい

Q　目安（12/11・12/18）に間に合わないときは

A　目安は、ビジネス部門と合意して調整してよい。理由と見込みを早めに事務局に伝える
12月末の稟議の承認に間に合うよう、事務局が横並びで調整し、必要なら IT部門長に相談する

第2章　移管後の体制と役割

業務の3つの層と役割 ／ RACI と体制（IT投資・経費） ／ GAMP カテゴリ ／ 提言 ／ Q&A

業務の3つの層と役割

移すのは間接業務。 IT関連業務（中間層）は案件ごとに合意する。どの層でも、業務の最終責任（　　A）はプロセスオーナーに残る

	PO　プロセスオーナー 移管元の部門長。業務プロセスと、業務アプリケーションの要否・目的・便益に最終責任を持つ	BU　ビジネス担当 部門の担当者。システムを使って業務を行い、要望を出し、受け入れを確かめる	SO　システムオーナー IT部門。システムの可用性・保守・セキュリティに責任を持つ。A は引き取らない
直接業務 移さない	**A** 業務要件・受け入れを決める	**R** システムを使った業務、要件の整理、受け入れの確認	**C** 相談を受ける
IT関連業務 中間層。R の分担を案件ごとに合意	**A** 判断・承認（今回の移管では動かさない）	**R** 業務側の実務（業務への適合、効果、要望、受け入れの観点）	**R** 技術側の実務（投資：システム化の方針・見積・費用／経費：運用のモニタリング、改善の実施、契約の見直しの材料）
間接業務 移す（これまでは部門が担当）	**I** 報告を受ける	**—** 関与しない	**A / R** 予算の管理、契約、発注・検収・支払い（1月から）

IT関連業務は、12・13枚目の RACI テンプレートを案件ごとにカスタマイズし、移管元の責任者と合意して文書に残す

RACI：IT投資プロセス（Before → Transition → After）

PO：プロセスオーナー（部門長） BU：部門担当 IT：IT部門（移管前） SO：システムオーナー（IT部門） R：実行 A：最終責任 C：相談 I：連絡 （定義は14枚目）

活動	層	Before（現状）			Transition（移行）			After（移管後）		
		PO	BU	IT	PO	BU	SO	PO	BU	SO
I-1 課題・ニーズの特定	直接	A	R		A	R	**C**	A	R	C
I-2 業務要件の定義	直接	A	R		A	R	**C**	A	R	C
I-3 解決策の検討（業務の進め方・業務への適合、システム化の方針・既存システムとの整合）	**IT関連**	A	R	C	A	R	**C→R**	A	R	**R**
I-4 ベンダー情報の収集・見積の取得（業務要件の提示・デモでの業務評価、見積の取得・技術面の評価）	**IT関連**	A	R	C	A	R	**C→R**	A	R	**R**
I-5 投資効果と費用の算定	**IT関連**	A	R	C	A	R	**C→R**	A	R	**R**
I-6 予算要求・投資申請の作成（目的・効果、費用・技術・リスクの記述）	**IT関連**	A	R	C	A	R	**C→R**	A	R	**R**
I-7 投資の決裁	—	A	R		**決裁者：新しい ITガバナンス（Tier）で検討中**					
I-8 ベンダーの選定（業務への適合、技術・契約条件の評価）	**IT関連**	A	R	C	A	R	**C→R**	A	R	**R**
I-9 契約の締結	間接	A	R		**I**		**A/R**	I		A/R
I-10 発注・検収・支払いの手続き	間接	A	R				**A/R**			A/R
I-11 プロジェクトの推進（業務面・技術面の進捗と品質）	**IT関連**	A	R	C	A	R	**C→R**	A	R	**R**
I-12 受け入れ（業務要件を満たすか）	直接	A	R		A	R	**C**	A	R	C
I-13 効果の確認（事後評価）	**IT関連**	A	R	C	A	R	C	A	R	C

- Before：これまでの分担（IT関連業務は部門がR、IT部門がC）。Transition：SO が R を持ち始める（上限は2027年度末）
- After：A はプロセスオーナーに残し、IT関連業務は部門とSO の両方が R を持って協力する。色付きのマスは、一つ前の段階から変わるところ
- 太枠は案件ごとに協議する行。協議するのはR の分担（どこまでをどちらが担うか）とTransition の期間だけで、A の列と直接・間接の行は変えない

RACI：経費プロセス（ Before → Transition → After）

PO：プロセスオーナー（部門長） BU：部門担当 IT：IT部門（移管前） SO：システムオーナー（IT部門） R：実行 A：最終責任 C：相談 I：連絡 （定義は15枚目）

活動	層	Before（現状）			Transition（移行）			After（移管後）		
		PO	BU	IT	PO	BU	SO	PO	BU	SO
E-1 システムを使った業務	直接	A	R		A	R		A	R	
E-2 サービスレベル（SLA）の要求の決定	直接	A	R		A	R	**C**	A	R	C
E-3 利用ルールの決定（ライセンスの割当て方針・運用設計）	直接	A	R		A	R	**C**	A	R	C
E-4 部門で行う運用（ルールに沿ったユーザー・権限の管理）	直接	A	R		A	R	**C**	A	R	C
E-5 予算の計上・執行の管理	間接	A	R		**I**		**A/R**	I		A/R
E-6 契約の更新・変更・解約の手続き	間接	A	R		**C**		**A/R**	C		A/R
E-7 請求書の受領・支払い	間接	A	R				**A/R**			A/R
E-8 委託先への指示・報告の受領（契約上の管理）	間接	A	R				**A/R**			A/R
E-9 運用状況のモニタリング（SLA の達成状況・障害・利用状況）	**IT関連**	A	R		A	R	**C→R**	A	**C**	**R**
E-10 改善活動（要望と優先順位、整理と実施）	**IT関連**	A	R		A	R	**C→R**	A	R	**R**
E-11 契約の見直しの材料の整理（利用実態・ライセンス数・代替案）	**IT関連**	A	R		A	R	**C→R**	A	**C**	**R**
E-12 契約を続けるかどうかの判断	直接	A	R		A	R	**C**	A	R	C
E-13 ベンダーの評価（業務面の満足度・対応、SLA・技術面）	**IT関連**	A	R		A	R	**C→R**	A	R	**R**
E-14 GxP の変更管理	**IT関連**	A	R		A	R	**C→R**	A	R	**R**

- Before は部門が単独で行っている状態（初版はNパターン）。Transition・After・太枠の決まりはIT投資プロセスと同じ
- 決めること（E-2・E-3・E-12）は部門に残す。SO は要求に沿ってモニタリングの仕組みと閾値を設定し、見直しの材料を整える
- E-14 には本来、品質保証部門の関与が要る（表では省略）。担当の変更に手続きが要る間は、経過措置として今の担当が続ける

RACI の適用例：プロジェクト体制

RACI マトリクスをもとにプロジェクト体制を設計・構築するときの、標準的な役割と成果物の責任の雛形として使うことを想定する

記号と定義		プロジェクトオーナー	プロジェクトマネジャー	領域リード（業務）	技術リード（IT）	開発・導入ベンダー	SME（有識者）	関係部門
A 最終責任	結果に責任を持ち、承認する（1人）	●						
R 実行	成果物を作り、期限までに完了させる		●	●	●	●		
C 相談	意見を出し、レビューする（成果物の責任は負わない）						●	
I 連絡	結果の報告を受ける							●

成果物（例）	成果物ごとの RACI（例）						
プロジェクトチャーター	A	**R**	C	C			I
RFP（提案依頼書）	A	C	**R**	**R**		C	
業務要件	A	C	**R**	C	C	C	I
システム要件	A	C	C	**R/C**	**R**	C	
移行要件	A	C	**R**	**R/C**	**R**	C	
テスト計画	A	C	C	**R/C**	**R**		
受け入れ基準書	A	C	**R**	C	C	C	

R を持つリードが成果物を作る（R が複数なら協力して作る）。R/C は、ベンダーと分担して作るか、レビューするかを案件ごとに決める。プロジェクトマネジャーを部門と IT部門のどちらから出すかは、案件ごとに協議する

RACI の適用例：運用体制

RACI マトリクスをもとに運用体制を設計・構築するときの、標準的な役割と成果物の責任の雛形として使うことを想定する

記号と定義		サービス オーナー	業務管理者（業務）	システム管理者（IT）	サービス マネジャー	品質保証（GxP）	利用者
A 最終責任	結果に責任を持ち、承認する（1人）	●		●			
R 実行	成果物を作り、期限までに完了させる		●	●	●		
C 相談	意見を出し、レビューする（成果物の責任は負わない）					●	
I 連絡	結果の報告を受ける						●

成果物（例）	成果物ごとの RACI（例）					
サービスレベル要求（SLA の要求）	A	**R**	C	C		I
利用ルール（ライセンスの割当て方針）	A	**R**	C			I
運用設計書（監視・閾値・障害対応）	A	C	**R/C**	**R**	C	
運用手順書（SOP を含む）	A	C	**R/C**	**R**	C	
契約書・契約上の SLA	C	C	**A/R**	C		
月次の運用報告（SLA 実績・利用状況）	A	C	**R/C**	**R**		I
契約の見直しの材料（利用実態・代替案）	A	C	**R**	C		

R を持つ役割が成果物を作る（R が複数なら協力して作る）。R/C は、サービスマネジャーと分担して作るか、レビューするかを案件ごとに決める。契約書など間接業務の成果物は、IT部門が A/R を持つ

参考：GAMP のソフトウェアカテゴリと RACI

カテゴリが決めるのはバリデーションの範囲。業務の最終責任（ A）はカテゴリで変わらないので、 RACI はカテゴリで分けない

カテゴリ 1
基盤ソフトウェア

定義
アプリケーションが動く基盤と、運用環境を管理するソフトウェア

例
OS、データベース、ミドルウェア、ネットワーク、ウイルス対策

検証の対応
バージョンを記録する。アプリケーションの検証の中で間接的に確かめる

カテゴリ 3
構成設定していないソフトウェア

定義
市販の既製パッケージを、業務に合わせた構成設定をせずに使うもの（実行時のパラメータ入力だけのものを含む）

例
測定・分析機器のソフトウェア、標準的な市販ソフトウェア

検証の対応
バージョンを記録し、要求を満たすことを確かめる

カテゴリ 4
構成設定したソフトウェア

定義
市販パッケージを、業務プロセスに合わせて構成設定（設定値・ワークフロー等）して使うもの

例
ERP、LIMS、文書管理システム

検証の対応
構成を仕様書で管理し、要求を満たすことを確かめる。重要なものは供給者を監査する

カテゴリ 5
カスタムソフトウェア

定義
業務に合わせて個別に設計・開発したもの（パッケージへの追加開発部分を含む）

例
自社開発システム、アドオン、マクロ

検証の対応
供給者を監査し、設計・コードを含むシステム全体をバリデーションする

カテゴリ 2（ファームウェア）は現在使わない（GAMP 5 で廃止）

方針

RACI はカテゴリで分けない

12・13 枚目のテンプレート 1 組を、GxP 対象・対象外とも共通で使う

- **A はカテゴリで変わらない**：外部に委託しても、責任は自社に残る。社内で誰が A を持つかは、カテゴリではなく SOP で決まる。分けると A がカテゴリで動くように見える
- **カテゴリはソフトウェア単位で決まる**：1 つのシステムにカテゴリ 4 と 5 が混在し、1 案件に複数のシステムが紐づく。テンプレートを分けると使い分けられない
- **GxP 対象外には分類の義務がない**：J-SOX も、自社開発かパッケージ（変更なし／機能追加）かを、リスクの重さを変える要素として扱うだけ。提供形態で見ればよい
- **規制がかかる業務は既存の手順を正とする**：GxP は SOP と品質保証部門の関与、J-SOX は IT 全般統制の手順に従う
- **カテゴリ・提供形態はカスタマイズの判断材料**：個別開発に近いほど、IT 関連業務で SO が担う R は重くなり、引き取る時期は遅くなる

提言：IT予算は「分けて」持つ

「事業側か、IT部門側か」の二択にしない。お金・契約・事務は IT部門に、業務の最終責任（A）は事業側に置く。そのための 4つの条件

① 予算と責任を分ける理由

お金の流れは IT部門に集め、業務の判断は事業側に残す

- IT部門に集めるのは予算・契約・間接業務。全社共通の基盤への影響の統制、ベンダーとの交渉力、重複の排除、IT費用の全社での可視化のため
- 業務アプリケーションの要否・要件・受け入れは、業務を知る側にしか判断できない。A は事業側に残す（プロセスオーナー原則）
- 問うべきは「どちらが持つか」ではなく「何をどちらが持つか」

② 配分権の帰属

枠は全社で決め、枠の中の優先順位は事業側が決める

- 部門ごとの予算の枠と投資の決裁は、新しいITガバナンス（Tier）で決める
- 枠の中でどの案件を優先するかは、プロセスオーナー（PO）が決める
- IT部門（SO）は費用の妥当性と既存システムとの整合を評価し、異を唱える。合意できなければ Tier に上げる（IT部門が単独で止めない）

③ コスト意識の歯止め

払わなくなっても、使った費用は部門に見せる

- 移管した費用を、部門別・案件別に毎期示す（単価と内訳の開示）
- 削減した費用の一部を部門に返す（比率は未定）
- 配賦・チャージバックに進むかは、1年分の実績を見て判断する

④ 中間層の移行期限

SO が担う R の範囲を、期限を切って確定させる

- IT関連業務は、部門と SO の両方が R を持って協力する。部門が C に下がって IT部門に任せる形にはしない
- SO が R を持ち始める時期に上限を置く（例：次回の契約更新、遅くとも2027年度末）
- 上限を越えて Before のまま残す業務は、理由を合意文書に書き、事務局が横並びで確かめる

Q&A：移管後の体制と役割

A はプロセスオーナーに残る。SO は実務を担い、判断材料を出す

Q 部門から「IT部門にすべて任せたい」と言われたら

A 任せる形にはしない。IT関連業務は、部門と SO の両方が R を持って協力する
業務への適合・効果・受け入れは BU の R として残り、要件・優先順位・投資の要否は PO が決める

Q RACI は案件ごとに、どこまで変えてよいか

A 協議するのは、IT関連業務の R の分担（どこまでを部門と SO が担うか）と、SO が R を持ち始める時期（上限は 2027 年度末）だけ
A の列と、直接・間接の行は変えない

Q 部門の担当者が、委託先に直接作業を頼んでいたら

A 委託先への指示と報告の受領は、間接業務として IT部門に移る
契約外の作業の依頼や追加の発注の約束は、BU がしてはいけないこと。移管の直後は手順を変えずに引き継ぐ

Q GxP 対象のシステムでも、この RACI をそのまま使うのか

A GxP 対象の業務は、品質保証部門が定める SOP・手順が正となる。この RACI は雛形として使う
齟齬がある場合は品質保証部門の定めに従い、合意文書の側を合わせる。担当の変更に手続きが要る間は経過措置とする

第3章　固定資産の扱い

型A（標準）：IT部門が持つ ／ 型B（個別に選択）：受益部門が持つ ／ 比較 ／ Q&A

型A（標準）：固定資産は予算を持つ　IT部門が持つ

予算を持つ IT部門が資産と償却費も管理する。コストセンターを分けて費用を見せ、研究開発・製造の費用は受益部門に配賦する

IT投資の種類	仮勘定	本勘定（固定資産の所有者＝償却費の負担部門）		
		個別（単一部門）	共通（複数部門）	全社共通（全部門・基盤）
① 業務アプリの新規導入（パッケージ・構成設定）	IT部門	IT部門 ※1	IT部門 ※1	該当なし
② 業務アプリの個別開発・アドオン	IT部門	IT部門 ※1	IT部門 ※1	該当なし
③ 既存資産の改修（資本的支出）	IT部門	IT部門 ※2	IT部門 ※2	IT部門
④ ソフトウェアライセンスの買取	なし	IT部門 ※1	IT部門 ※1	IT部門
⑤ ハードウェア・機器	なし	IT部門 ※1	IT部門 ※1	IT部門
⑥ 基盤・共通サービス（クラウド、データなど）	IT部門	該当なし	IT部門	IT部門（移管の対象外）

- 移管の前に取得した資産と、部門に残る継続の投資案件で完成する資産は、部門が持ったままになる（※2）
- 本勘定への振替は IT部門の中で完結する。除却・減損は PO が判断し、手続きは IT部門が行う
- ※ の番号は、22枚目の「決める点」に対応する

型B（個別に選択）：固定資産は受益部門が持つ

投資予算と仮勘定は IT部門が持ち、完成した資産と償却費は便益を受ける部門が持つ

IT投資の種類	仮勘定	本勘定（固定資産の所有者＝償却費の負担部門）		
		個別（単一部門）	共通（複数部門）	全社共通（全部門・基盤）
① 業務アプリの新規導入（パッケージ・構成設定）	IT部門	受益部門	主管部門 ※1	該当なし
② 業務アプリの個別開発・アドオン	IT部門	受益部門	主管部門 ※1	該当なし
③ 既存資産の改修（資本的支出）	IT部門	既存資産の所有部門	既存資産の所有部門 ※2	IT部門
④ ソフトウェアライセンスの買取	なし	受益部門	主管部門 ※1	IT部門
⑤ ハードウェア・機器	なし	受益部門	主管部門 ※1	IT部門
⑥ 基盤・共通サービス（クラウド、データなど）	IT部門	該当なし	IT部門 ※3	IT部門（移管の対象外）

- 主管部門：共通システムのプロセスオーナー（PO）の部門。共通のシステムでも PO は1人とする原則に揃える
- 本勘定への振替は、検収または使用の開始の時点で IT部門が行う。除却・減損は PO が判断し、手続きは IT部門が行う
- ※ の番号は、22枚目の「決める点」に対応する

固定資産の扱い：型 Aと型Bの比較

型A を標準とし、型B は事情がある案件で個別に選ぶ。型 A では Showback と Chargeback を分けて扱う

	型A（標準）：資産は IT部門	型B（個別に選択）：資産は受益部門
Pros	• 予算・発注・資産・除却の手続きが IT部門で完結し、振替が要らない • IT資産を全社で一元的に把握できる（一元管理と可視化の目的に合う） • 共通資産の所有で揉めないので、共通化を進めやすい • 償却費を含めた総保有コストで、IT部門が投資を評価できる	• 便益と費用の負担が同じ部門になる（プロセスオーナー原則と一致） • 償却費が部門の損益に出るので、配賦しなくてもコスト意識が働く • 既存資産・継続の投資案件と同じ扱いで、資産の移し替えが要らない • 除却の判断（PO）と資産の保有が一致する
Cons	• 便益（部門）と費用（IT部門）が分かれる。研究開発・製造の費用は、会計上の区分を保つため受益部門に配賦する必要がある • 配賦には、按分の基準と部門への説明が要る • 既存資産と継続案件の資産は部門に残り、所有者が二通りになる • 業務の最終責任（A）は部門、資産は IT部門となり、除却の判断と保有が分かれる	• 予算（IT部門）と資産（部門）が分かれ、振替と償却費の見込みの連携が要る • IT部門が評価した投資の償却費を部門が負うので、PO の合意が前提になる • 共通資産では主管部門に負担が偏り、共通化を嫌がる要因になる • IT資産の総額が部門に分散し、全社で見えにくい
決める点	※1 コストセンターの分け方（部門別・案件別）と、研究開発・製造に関わる費用・償却費の受益部門への配賦の方法 ※2 既存資産と継続案件の資産を IT部門に移すか。移さないなら改修分を別の資産にするか	※1 共通資産の償却費を、他の利用部門に按分するか（主管部門がすべて負担するか） ※2 改修で個別から共通に変わったとき、所有者を見直すか ※3 複数部門が使う基盤を、IT部門と主管部門のどちらが持つか ※4 償却費の見込みを部門に渡す方法（2028年度の予算編成から）

両方の型に共通して決める点　据付・検証に期間がかかる機器（GxP 対象など）の仮勘定／本勘定への振替の時期と手続き／資本的支出と修繕費の判定（IT部門が案を作り、経理部門が確定）／除却・減損の判断と手続きの分担

Q&A：固定資産の扱い

型A を標準とし、型B は事情がある案件で個別に選ぶ

Q 固定資産は、どちらが持つのか

A 型A（IT部門が持つ）を標準とする。予算・資産・償却費を、まとめて IT部門が管理する
事情がある案件は、ビジネス部門と合意して型 B（受益部門が持つ）を選べる。その場合は経理部門の確認を得る

Q 型A だと、部門の費用はどう扱われるのか

A Showback（費用を見せる）と Chargeback（受益部門に計上する）は別。本社機能は、コストセンターを分けて見せれば足りる
研究開発・製造に関わる費用と償却費は、会計上の区分（研究開発費・製造原価）を保つため受益部門に配賦する。配賦の方法は経理部門と決める

Q 経費予算に、減価償却費は含まれるか

A 含めない。減価償却費は予算移管の対象ではなく、固定資産を管理する部門に計上する（型 A は IT部門、型B は受益部門）

Q 移管の前に取得した資産は、どうなるか

A 資産をどちらが持つかによる
型A なら、IT部門に移すかどうかを決める必要がある（ 22枚目 型A の ※2）。型B なら、部門が持ったまま（今年度から続く投資案件で完成する資産も同じ）

第4章　コミュニケーション

コミュニケーションの流れ／ Q&A ／ 連絡先と情報共有チャネル

コミュニケーションの流れ

部門との窓口は各チームの窓口担当、IT部門長への相談は事務局。情報は予算移管シートと SharePoint に集める



情報	置き場所・手段	更新と確認
進捗・移管ステータス	予算移管シート（予算一覧・進捗）	窓口担当が随時更新し、事務局が毎日確認する
部門とのやり取りの記録	双方が編集できるSharePoint フォルダ	ヒアリングの記録、受け取った資料、承認された合意文書を置く
決まったこと	決定記録（BTR-F-15）	決定事項・保留課題と、承認された合意文書を登録する
手順とルール	手順書・用語集など	迷ったら手順書を見る。決まらないことは事務局に相談する

Q&A：コミュニケーション

部門との窓口は普段の窓口担当に一本化し、記録は決まった場所に残す

Q 部門から、事務局に直接問い合わせが来たら

A 事務局が受けて、その案件の窓口担当につなぐ
部門とのやり取りは、普段の窓口担当に一本化する

Q 部門の担当者と合意した内容は、どこに残すか

A 承認された合意文書を、双方が編集できる SharePoint フォルダに保存し、決定記録に登録する
口頭やメールだけの合意で終わらせない

Q 進捗は、どのように報告すればよいか

A 報告書は作らない。予算移管シートの移管ステータスと「進捗」シートを更新すれば、事務局が毎日確認する

Q IT部門長に相談したいことがあるときは

A 事務局に伝える。IT部門長への依頼と相談は事務局が行う
決まったことは決定記録に登録し、全員が同じ内容を見られるようにする

連絡先と情報共有チャネル

まず窓口担当、全体のことは予算移管事務局へ

連絡先

予算移管事務局

全体の進め方、期限、IT部門長への相談

［氏名・メールアドレスを記入］

窓口担当

案件ごとの窓口

予算移管シート「予算一覧」の担当者の列で確かめる

移管対象部門の責任者・担当者

承認の依頼先・問い合わせ先

予算移管シート「窓口」シートで確かめる

情報共有チャネル

質問・相談のチャネル

気づいたこと、迷ったことを共有する

［Teams のチャネル名などを記入］

予算移管シート

進捗と移管ステータス

窓口担当が随時更新、事務局が毎日確認

SharePoint フォルダ（案内済み）

ヒアリングの記録・資料・合意文書

事業部門とIT部門の双方が編集できる

手順書・決定記録

手順、ルール、決まったこと

手順書、用語集、決定記録（BTR-F-15）
