「IT 部門向け予算ガイドライン」追補

IT 予算移管の要点

2026 年 11 月キックオフ

本書の位置付け

「IT 部門向け予算ガイドライン」の追補。 IT 予算移管に必要な箇所に絞って説明を補う

全社予算策定ガイドライン
全社

予算策定の全社の決まり。 IT 予算の移管はここで決定済み

IT 部門向け予算ガイドライン
GDS

GDS の予算の考え方と運用

本書：追補（IT 予算移管の要点）
GDS の各チーム

予算移管の方針と進め方、役割分担の雛形。方針以外は、各ファンクションと合意して決める

本書を使うときの決まり

- 本書とガイドラインに齟齬がある場合は、ガイドラインの定めに従う
- GxP 対象の業務は、品質保証部門が定める SOP ・手順が正となる。本書の役割分担は雛形として使う
- 本書の下には、憲章（運用の基準）、手順書（Runbook）と予算移管シートを置く。合意した内容は合意文書に残す

本書で扱うこと

本書は、予算移管を進めるうえで各チームが押さえる 3 つのことを扱う

1

今期の目標と達成状態を理解する

12 月末までに移管の稟議が承認されている状態と、そこに至る進め方

2

移管後の役割の変更

各ファンクションと GDS の役割分担（RACI）

3

IT 資産管理

固定資産と償却費の持ち方（予算を持つ GDS が持つ）

今期の目標

移管の稟議が、 12 月末までに承認されること

今期は 12 月末の移管の承認を目指す。移管による効果の創出は、来期に改めて検討する

前提

全社の方針として決定済み

- 経営で決定済み。全社向けの予算策定ガイドラインに明記されている
- 対象は営業部門以外の部門（人事・総務・財務を含む）。各部門には案内済み
- 範囲は、業務アプリケーションとその関連ツールの予算・契約・間接業務

方針

移す時期によって、予算を 3 つに分ける

2027 年 1 月 1 日にそろって移す
- 経費予算（保守・ライセンス・クラウド利用料・業務委託などの運用費用）

来年度予算から GDS が持つ
- 来年度に始める IT 投資案件の予算

移す時期を案件ごとに合意する
- 今年度から続く IT 投資案件（取得済みの資産、建設仮勘定、着手済みのもの）。時期は移管元と合意し、財務経理と確認する（7 枚目）


目標

12 月末に、移管の稟議が承認されている

12 月末までに終わっていること
- 稟議に必要な情報（移管する予算と契約、来年度予算、合意文書）が整理されている
- 合意文書に沿って引き継ぎが終わり、 1 月から GDS が契約の管理と支払いを始められる

移管後に順次対応すること
- 担当の変更に正式な手続き（ SOP の改訂、 GxP の変更管理など）が要る業務は、手続きが終わるまで今の担当が続ける（経過措置）。業務と完了予定は合意文書に残す
- 契約の署名者は次回の更新から GDS に変わる。請求書の宛名の変更は 2 月初旬までに相手先に連絡する

11 月～ 12 月の進め方（目安）

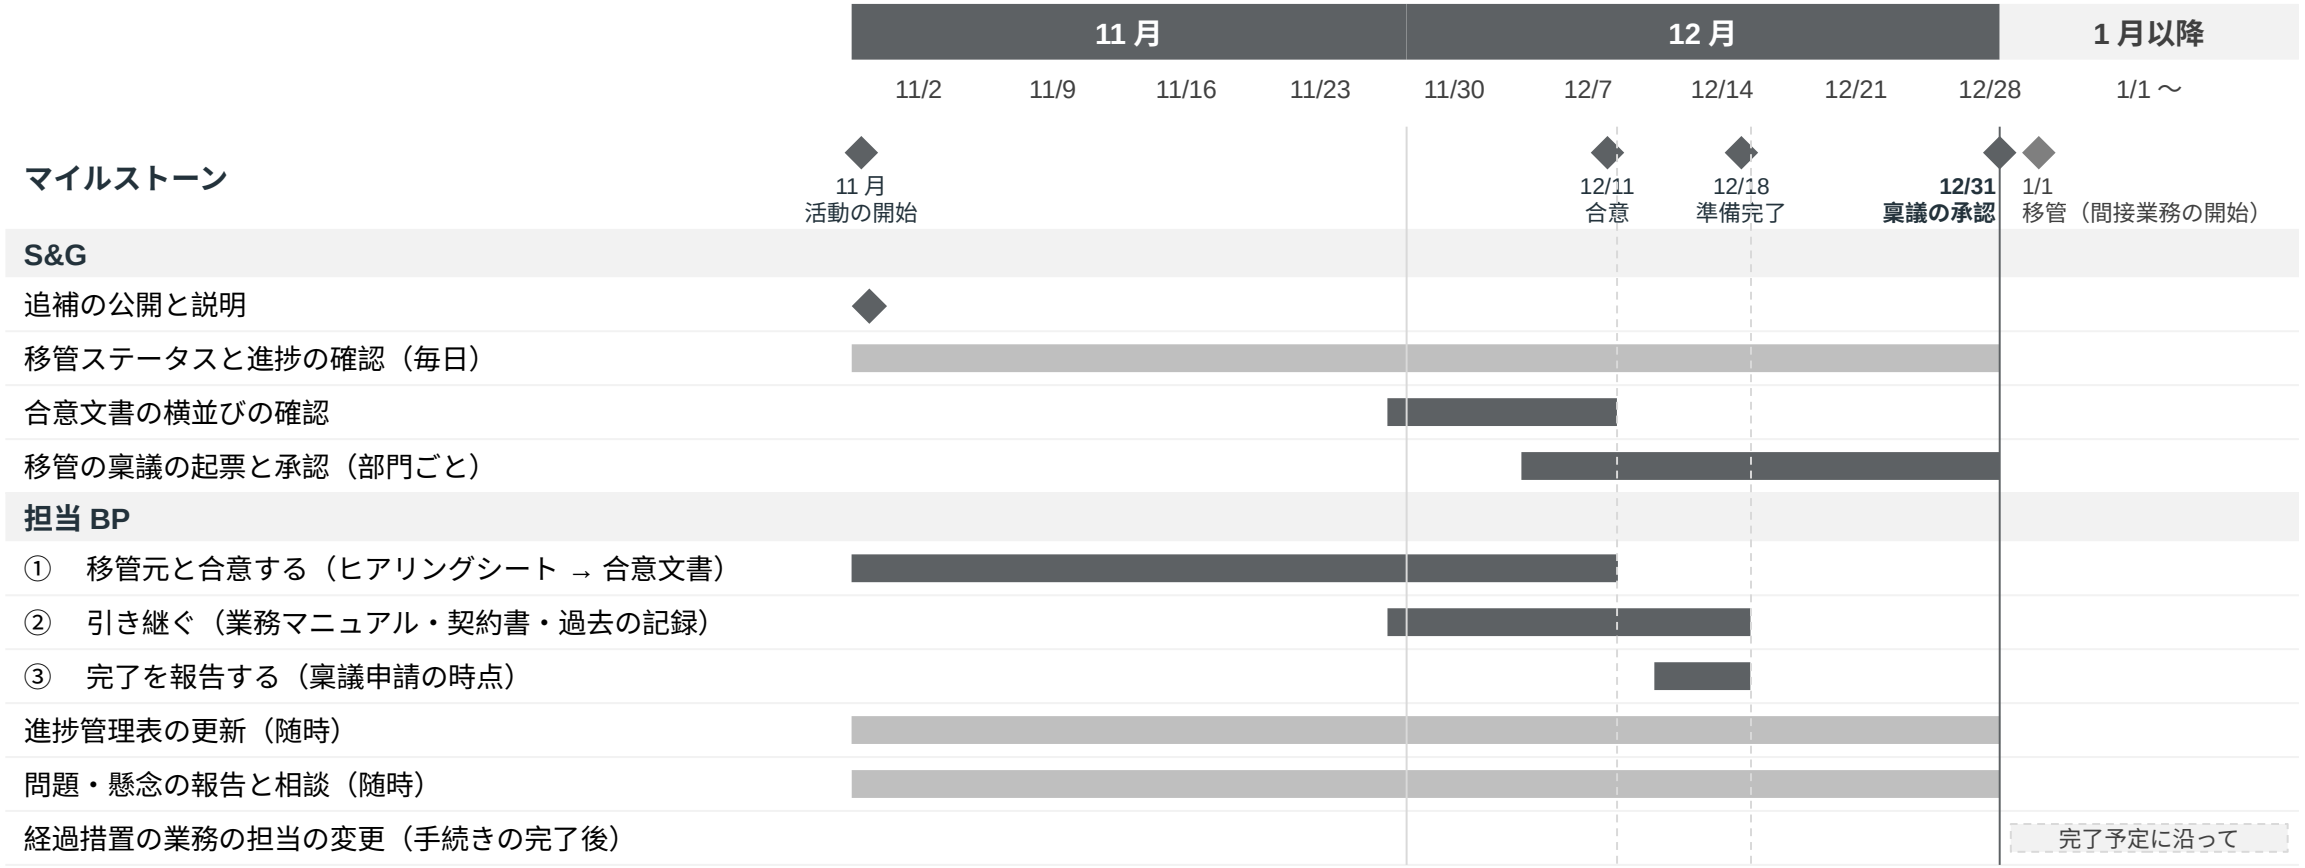

S&G の完了状態：移管の稟議が承認されている


そのための材料：全案件の合意文書と完了報告、進捗管理表（移管ステータス）がそろい、稟議に必要な情報（移管する予算と契約、来年度予算）が整理されている

担当 BP の完了状態：移管後の業務を開始できる

そのための材料：承認された合意文書（移管する予算と契約、引き継ぐ業務、報告・相談の方法、時期）と、引き継いだ業務マニュアル・契約書・過去の記録

移管後の役割分担（RACI）

IT 主導の領域は、GDS がリード（R）し、各ファンクションの助言（C）のもとで GDS が決定（A）する
ただし、ある部門に固有で、他への影響が一切ないシステムは、この限りではない

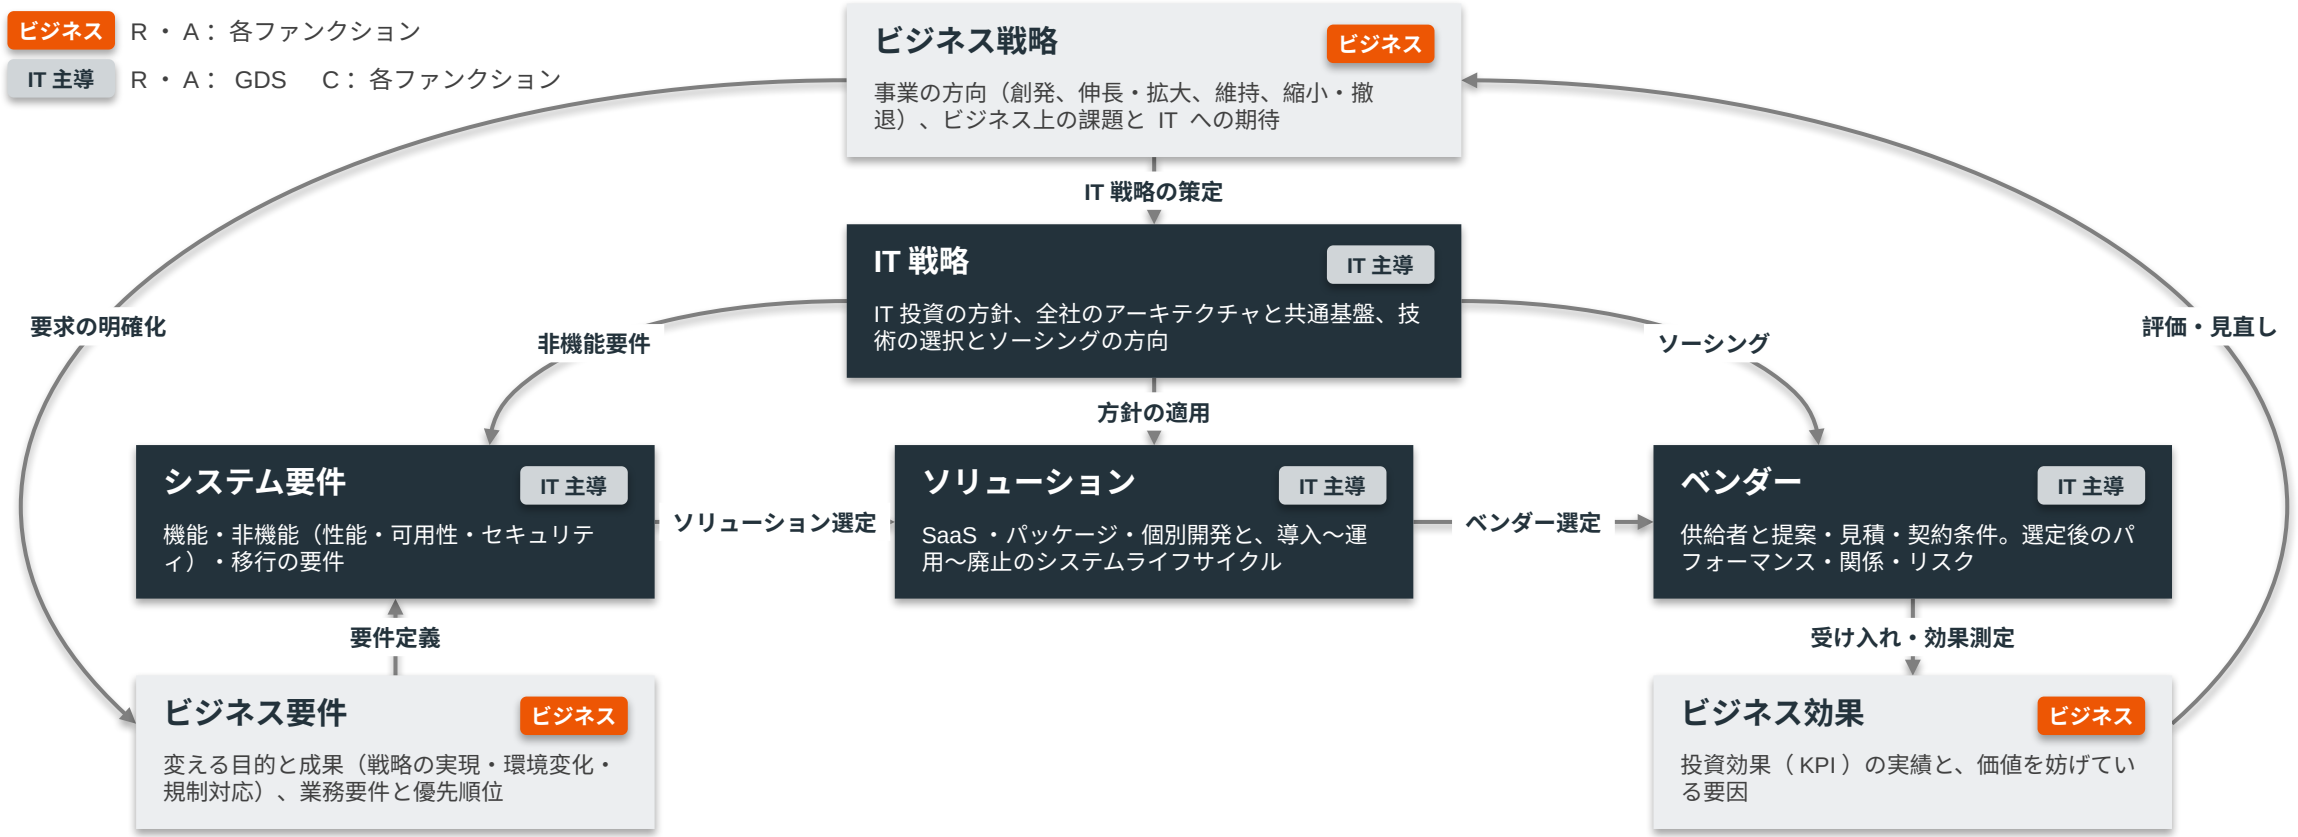

GDS のマネジメント（A・R）

IT 財務管理

予算の策定と執行、部門別・案件別の費用の見える化。投資の効果と費用を対比する

契約管理

ライセンス、クラウド・インフラ、保守、業務委託などの契約条件の合意と、利用実態に合わせた更新・見直し

サービス品質管理

サービスレベルの合意とモニタリング、検証（バリデーション）、変更管理（GxP を含む）

固定資産は予算を持つ GDS が持つ

予算を持つ GDS が資産と償却費も管理する。コストセンターを分けて費用を見せ、研究開発・製造の費用は受益部門に配賦する

IT 投資の種類	仮勘定	本勘定（固定資産の所有者＝償却費の負担部門）		
		個別（単一部門）	共通（複数部門）	全社共通（全部門・基盤）
① 業務アプリの新規導入（パッケージ・構成設定）	GDS	GDS	GDS	該当なし
② 業務アプリの個別開発・アドオン	GDS	GDS	GDS	該当なし
③ 既存資産の改修（資本的支出）	GDS	GDS	GDS	GDS
④ ソフトウェアライセンスの買取	なし	GDS	GDS	GDS
⑤ ハードウェア・機器	なし	GDS	GDS	GDS
⑥ 基盤・共通サービス（クラウド、データなど）	GDS	該当なし	GDS	GDS （移管の対象外）

予算移管の時点で進行中・保有中の資産

① 資産取得済み

移管の時点で資産に計上され、減価償却が始まっているもの

② 建設仮勘定

移管の時点で仮勘定に計上されており、来年度に資産を取得するもの

③ 着手済み・仮勘定なし

着手しているが、まだ仮勘定に全く計上されていないもの

いずれも GDS に移す。移す時期は移管元と合意し、あわせて財務経理と確認して、適切な会計処理ができるようにする
