# 「IT 部門向け予算ガイドライン」追補

IT 予算移管の要点

2026 年 11 月キックオフ

# 本書の位置付け

## 「IT 部門向け予算ガイドライン」の追補。 IT 予算移管に必要な箇所に絞って説明を補う

**全社予算策定ガイドライン**
全社

予算策定の全社の決まり。 IT 予算の移管はここで決定済み

**IT 部門向け予算ガイドライン**
GDS

GDS の予算の考え方と運用

**本書：追補（IT 予算移管の要点）**
GDS の各チーム

予算移管の方針と進め方、役割分担の雛形。方針以外は、各ファンクションと合意して決める

### 本書を使うときの決まり

- 本書とガイドラインに齟齬がある場合は、ガイドラインの定めに従う
- GxP 対象の業務は、品質保証部門が定める SOP ・手順が正となる。本書の役割分担は雛形として使う
- 本書の下には、憲章（運用の基準）、手順書（Runbook）と予算移管シートを置く。合意した内容は合意文書に残す

# 本書で扱うこと

**本書は、予算移管を進めるうえで各チームが押さえる 3 つのことを扱う**

1

## 今期の目標と達成状態を理解する

12 月末までに移管の稟議が承認されている状態と、そこに至る進め方

2

## 移管後の役割の変更

各ファンクションと GDS の役割分担（RACI）

3

## IT 資産管理

固定資産と償却費の持ち方（予算を持つ GDS が持つ）

# 今期の目標

**今期は 12 月末の移管の承認を目指す。移管による効果の創出は、来期に改めて検討する**

## 前提

全社の方針として決定済み

- 経営で決定済み。全社向けの予算策定ガイドラインに明記されている
- 対象は営業部門以外の部門（人事・総務・財務を含む）。各部門には案内済み
- 範囲は、業務アプリケーションとその関連ツールの予算・契約・間接業務

## 方針

移す時期によって、予算を 3 つに分ける

**2027 年 1 月 1 日にそろって移す**

経費予算（保守・ライセンス・クラウド利用料・業務委託などの運用費用）

**来年度予算から GDS が持つ**

来年度に始める IT 投資案件の予算

**移す時期を案件ごとに合意する**

今年度から続く IT 投資案件（取得済みの資産、建設仮勘定、着手済み）。財務経理と確認する（7 枚目）



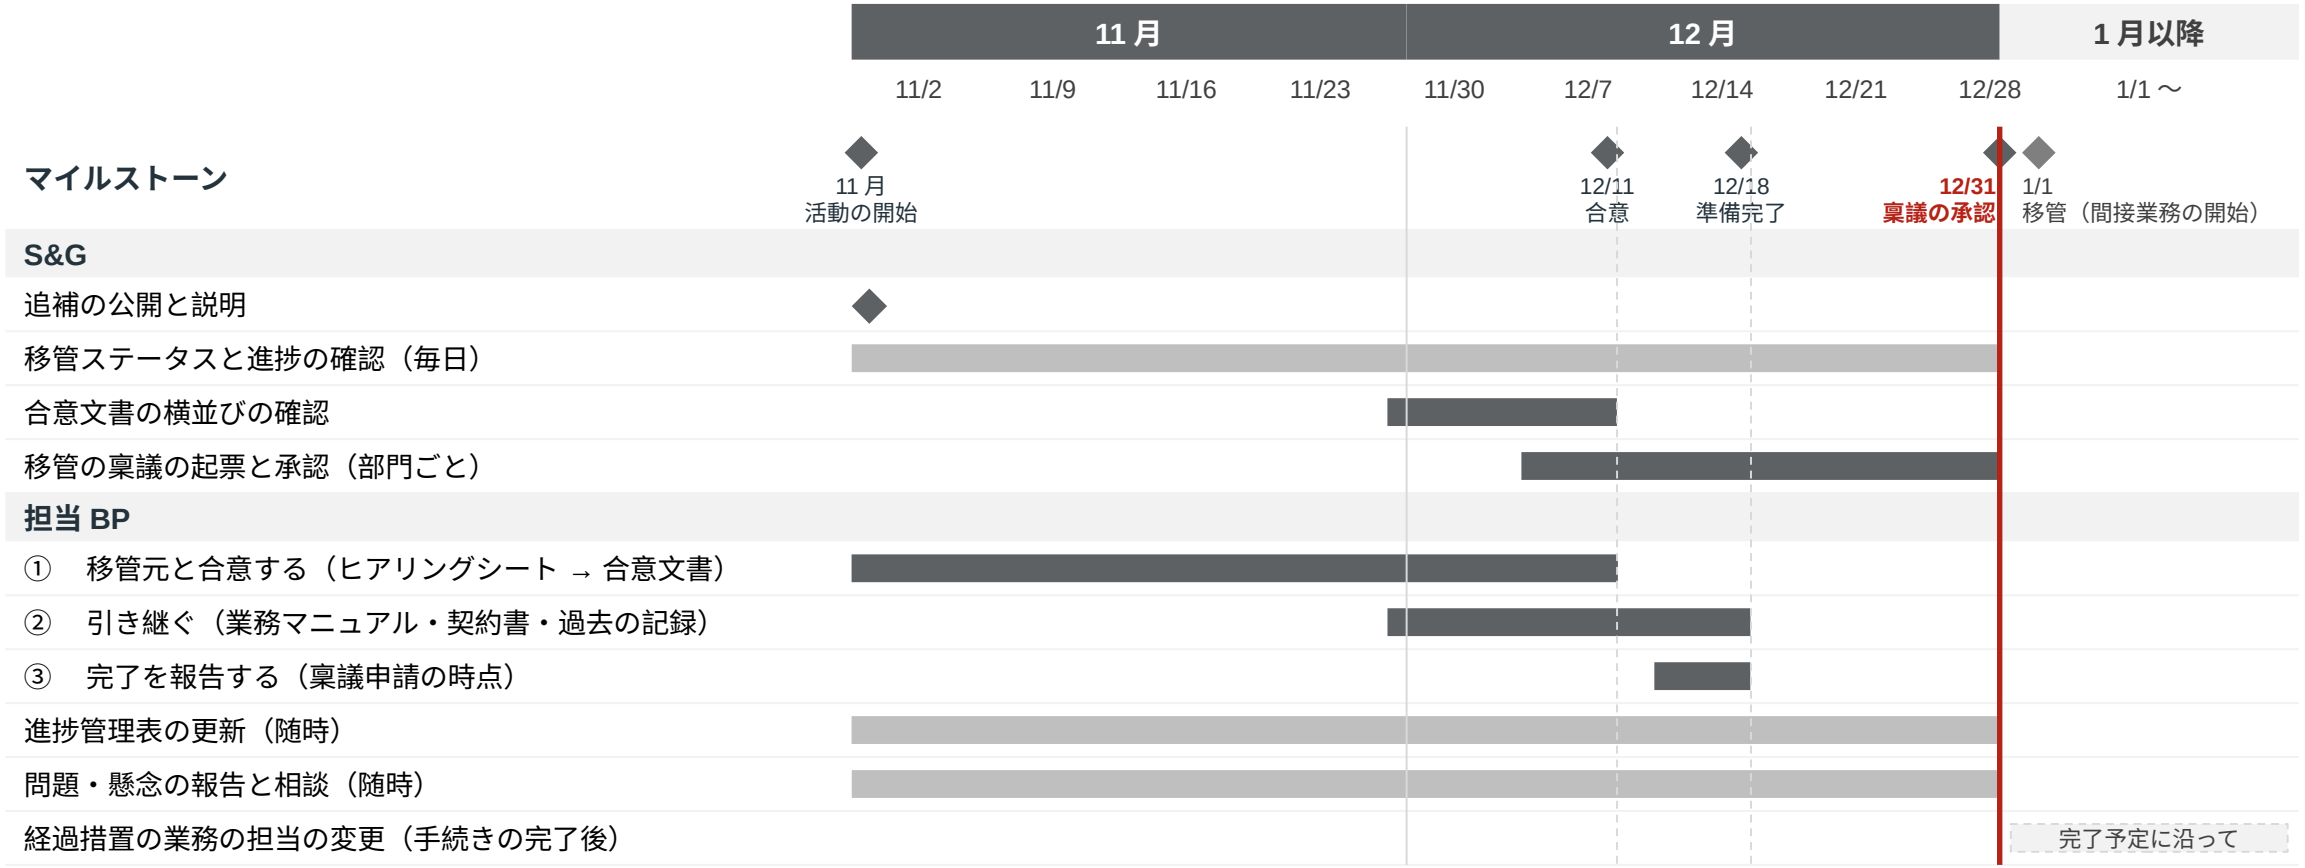

**移管後に順次対応すること**

**経過措置：** 担当の変更に正式な手続き（SOP の改訂、GxP の変更管理など）が要る業務は、手続きが終わるまで今の担当が続ける。業務と完了予定は合意文書に残す

**契約：** 署名者は次回の更新から GDS に変わる。請求書の宛名の変更は 2 月初旬までに相手先に連絡する

**目標： 12 月末に、移管の稟議が承認されている**

# 11 月～ 12 月の進め方（目安）




### S&G： 移管の稟議が承認されている

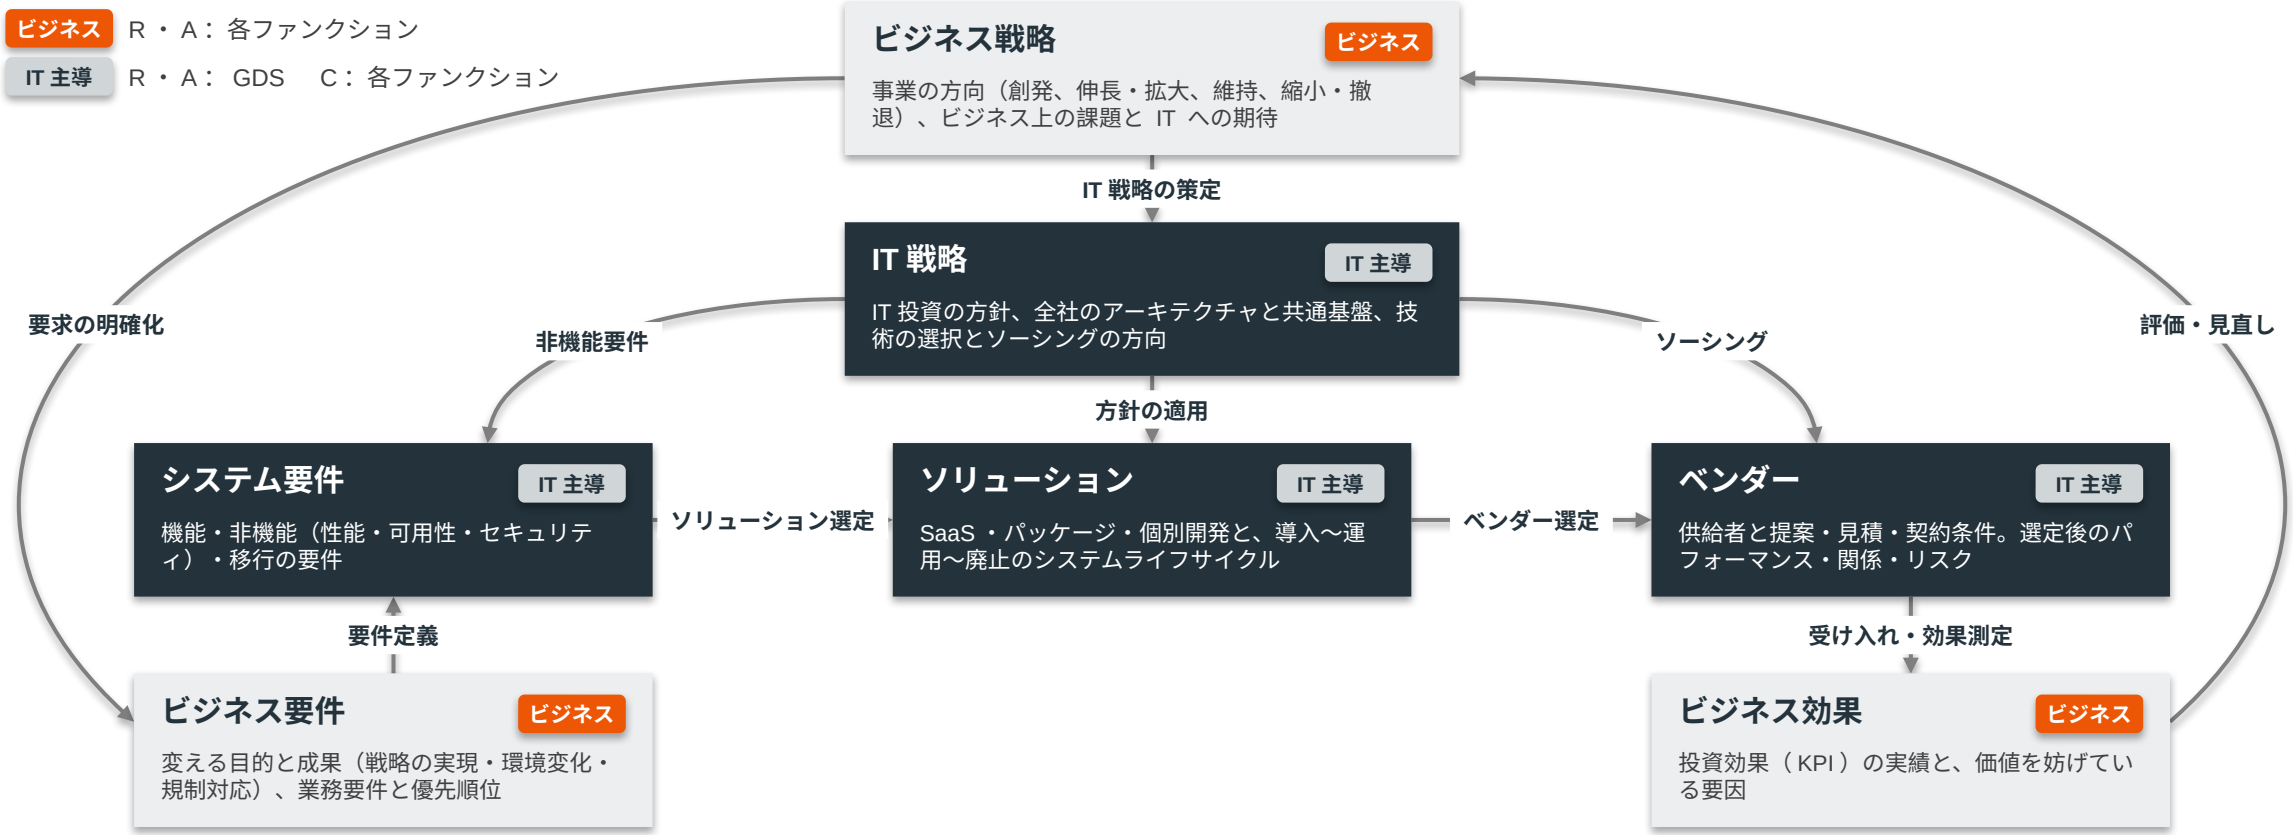
- ✓ 全案件の合意文書と完了報告がそろっている
- ✓ 進捗管理表（移管ステータス）が最新になっている
- ✓ 稟議に必要な情報（移管する予算と契約、来年度予算）が整理されている

### 担当 BP： 移管後の業務を開始できる

- ✓ 承認された合意文書（予算と契約、引き継ぐ業務、報告・相談の方法、時期）がある
- ✓ 業務マニュアル・契約書・過去の記録を引き継いでいる
- ✓ 1 月から GDS が契約の管理と支払いを始められる

# 移管後の役割分担（ RACI ）

**IT 主導の領域は、 GDS がリード（ R ）し、各ファンクションの助言（ C ）のもとで GDS が決定（ A ）する**
**ただし、ある部門に固有で、他への影響が一切ないシステムは、この限りではない**




| GDS のマネジメント（ A ・ R ） | IT 財務管理 | 契約管理 | サービス品質管理 |
|---|---|---|---|
| | 予算の策定と執行、部門別・案件別の費用の見える化。投資の効果と費用を対比する | ライセンス、クラウド・インフラ、保守、業務委託などの契約条件の合意と、利用実態に合わせた更新・見直し | サービスレベルの合意とモニタリング、検証（バリデーション）、変更管理（ GxP を含む） |

# 固定資産は予算を持つ GDS が持つ

**予算を持つ GDS が資産と償却費も管理する。コストセンターを分けて費用を見せ、研究開発・製造の費用は受益部門に配賦する**

| IT 投資の種類 | 仮勘定 | 本勘定（固定資産の所有者＝償却費の負担部門） | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 個別（単一部門） | 共通（複数部門） | 全社共通（全部門・基盤） |
| **① 業務アプリの新規導入（パッケージ・構成設定）** | GDS | GDS | GDS | 該当なし |
| **② 業務アプリの個別開発・アドオン** | GDS | GDS | GDS | 該当なし |
| **③ 既存資産の改修（資本的支出）** | GDS | GDS | GDS | GDS |
| **④ ソフトウェアライセンスの買取** | なし | GDS | GDS | GDS |
| **⑤ ハードウェア・機器** | なし | GDS | GDS | GDS |
| **⑥ 基盤・共通サービス（クラウド、データなど）** | GDS | 該当なし | GDS | GDS （移管の対象外） |

**予算移管の時点で進行中・保有中の資産**

**① 資産取得済み**

移管の時点で資産に計上され、減価償却が始まっているもの

**② 建設仮勘定**

移管の時点で仮勘定に計上されており、来年度に資産を取得するもの

**③ 着手済み・仮勘定なし**

着手しているが、まだ仮勘定に全く計上されていないもの

**いずれも GDS に移す。移す時期は移管元と合意し、あわせて財務経理と確認して、適切な会計処理ができるようにする**

# 次のアクション（11 月）

**キックオフの後、まず次の 3 つから始める**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | 担当 BP | ヒアリングシートを基に、移管元との合意を始める |
| ☐ | 担当 BP | 進捗管理表の自分の行を記入し、移管ステータスを更新できるようにする |
| ☐ | 担当 BP | 今年度から続く IT 投資案件（取得済みの資産、建設仮勘定、着手済み）を洗い出し、財務経理との確認の場を設ける |

**最終期限： 12 月 31 日　移管の稟議の承認**
