「IT 部門向け予算ガイドライン」追補

IT 予算移管の要点

2026 年 11 月キックオフ

この資料の位置付け

予算移管で問い合わせの多かった事項について、考え方と対応方法をわかりやすく、誤解なく伝える

目的	予算移管で問い合わせの多かった事項について、考え方と対応方法を図で示しています。個別の回答では伝わりにくい背景を補い、誤解なく理解していただくことが目的です。
QA 表との関係	個別の問い合わせと回答は、 QA 表にまとめています。この資料は、その背景にある考え方を整理したものです。必要に応じて、両方をあわせて参照してください。
使い方	GDS の移管担当者が、カウンターパートとなるビジネス側のメンバーと話すときに、同じ絵を見ながら目線を合わせるために使ってください。ご自身の理解の確認にも役立ててください。
更新	問い合わせの状況に応じて、随時追記・更新します。変更点は、更新履歴で確認してください。

更新履歴


更新日	更新内容
2026/11/02	初版を公開

この資料で扱うこと

ページ	トピック	概要
p.5	11 月〜 12 月の進め方	担当 BP と S&G （ FinanceBP ）のタスク、マイルストーン、完了の定義
p.6	移管後の役割分担：誰が何を決めるか	IT 領域で、各ファンクションが決めることと GDS がリードすること
p.7	役割分担プレイブック： GDS がリードする 4 つの場面	案件の持ち込み、ソリューション選定、意見が割れたとき、受け入れ。問いと仮説
p.8	固定資産は今後の取得分から GDS が持つ	既存資産は移さない。取得予定と将来取得の扱い

11 月〜 12 月の進め方（目安）


年内に発注が必要な案件は、予算移管を待たずに可能な範囲で手続きを始める
契約の名義変更は適切な時期に行えばよく、予算移管と同時である必要はない

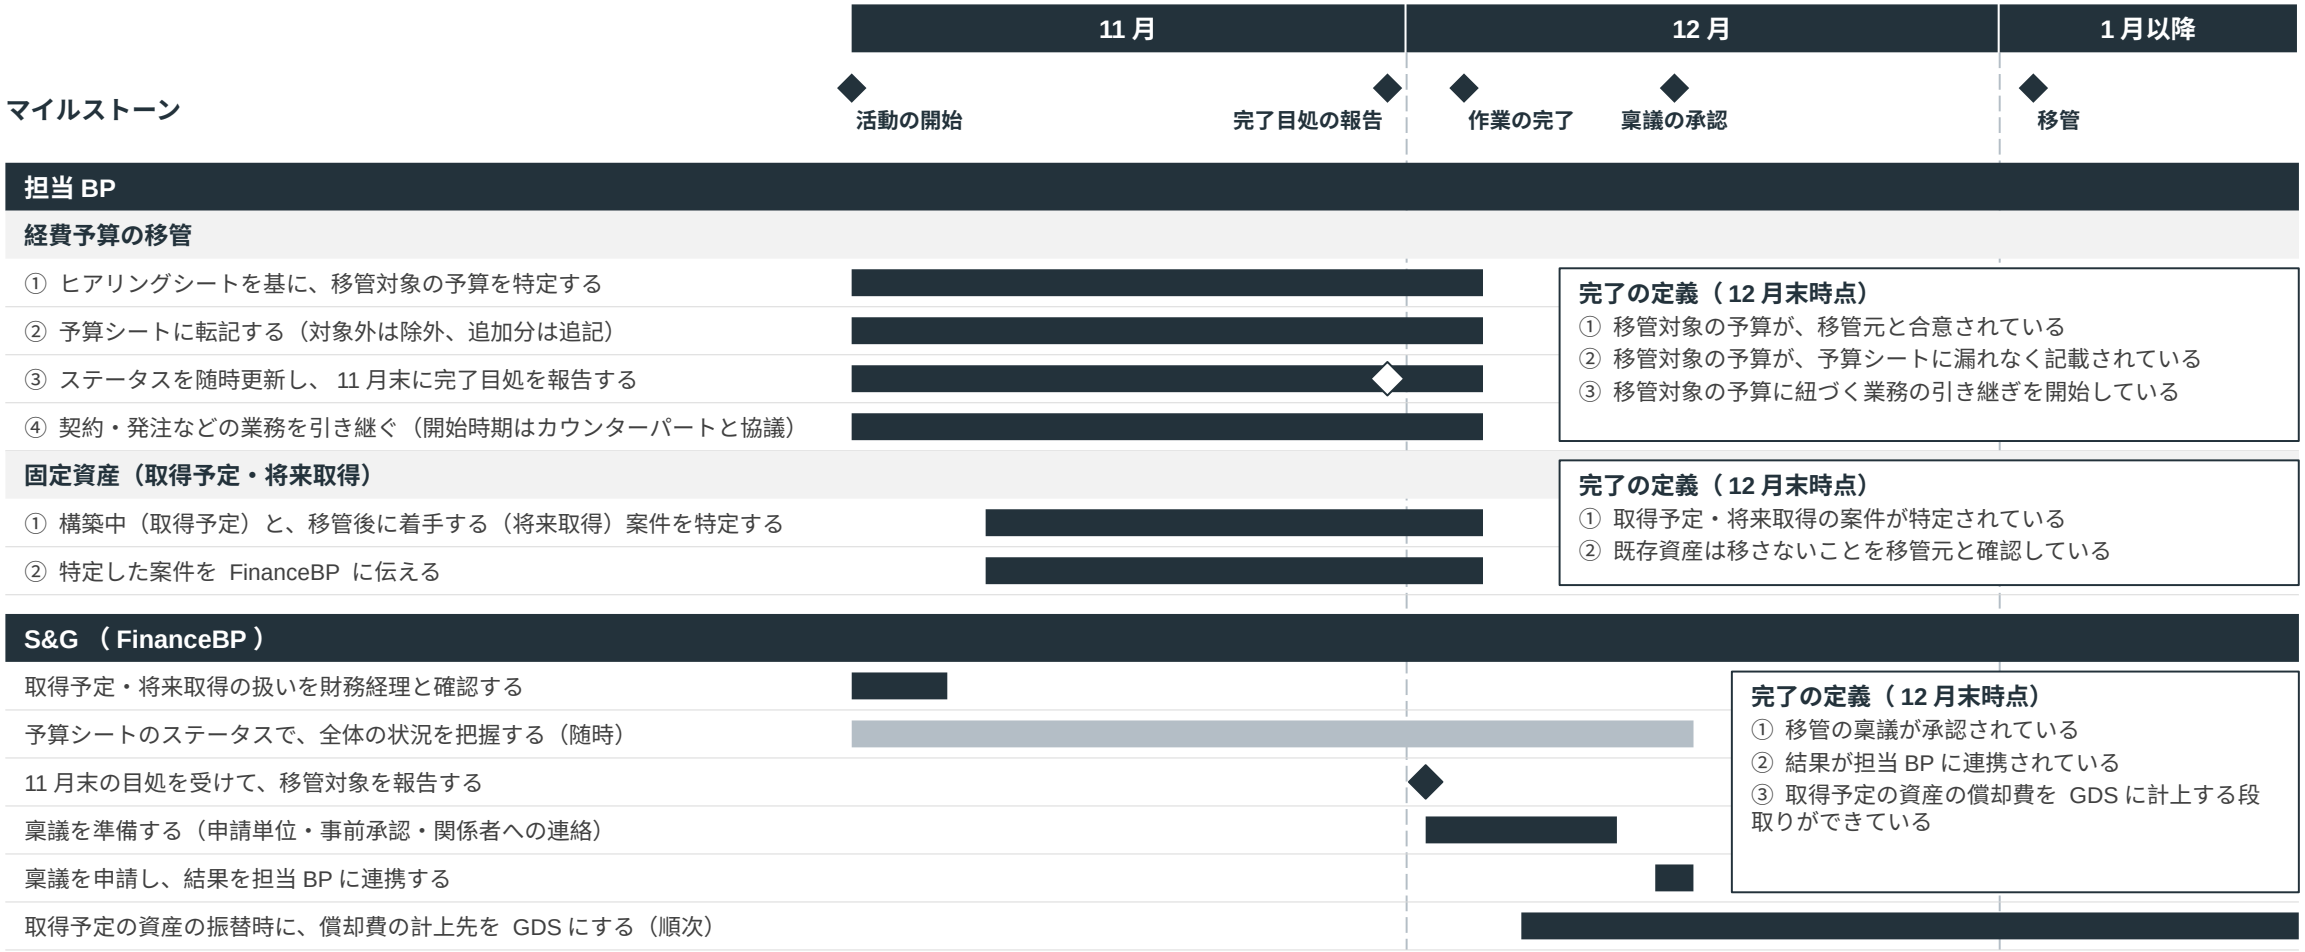

移管した予算に伴う間接業務（予算管理・契約管理・発注・支払）は、 GDS が責任を持って管理・実行する

移管後の役割分担：誰が何を決めるか

各ファンクションは「何を・なぜ実現するか」を決め、 GDS は「どう実現するか」をリードして決める
IT 領域は GDS と各ファンクションが協働し、全社共通と個別最適のバランスは GDS がとる

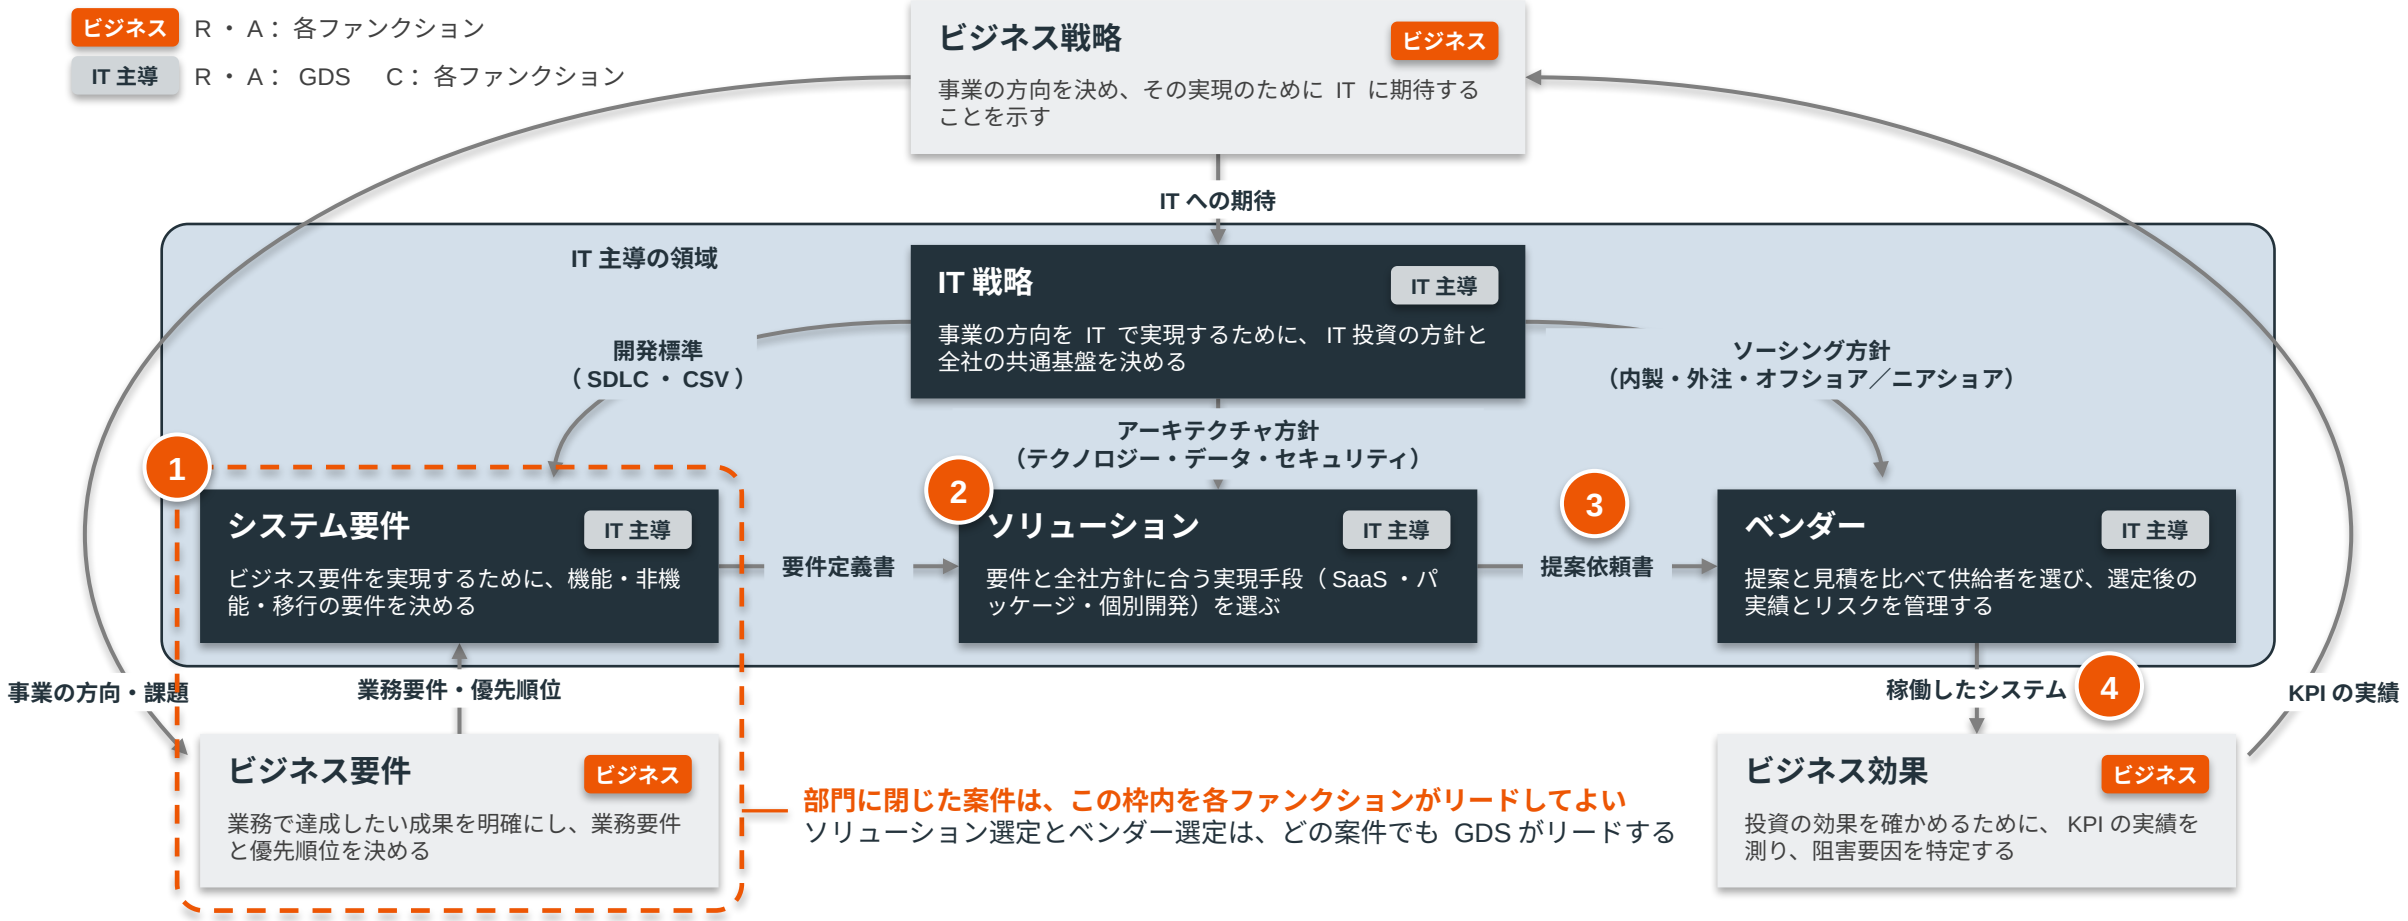

① ～④は、イシューが生じやすい場面。問いと仮説を先に持ち、準備できることは事前にしておく（次ページ）


役割分担プレイブック： GDS がリードする 4 つの場面

予算を持つ GDS は、実現手段の選択とその結果に説明責任を負う
つまずきの多くは、ファンクションとの合意が後回しになることで起きる。合意を先に取り、 GDS 内の機能を早く巻き込む

場面（ユースケース） 役割分担が試される、具体的な状況	イシュー（白黒をつける問い） 答え次第で打ち手が変わる、未決着の問い	仮説（ Playbook ） 問いへの現時点の答えと、その使い方。運用しながら検証し、更新する	解決のためのケイパビリティ 答えを出し、実行するために組み合わせる GDS の能力（ケイパビリティマップ L2）
① 案件の持ち込み ファンクションが「この製品を入れたい」と、手段を決めた状態で相談に来る	**この案件は、部門に閉じた案件として扱ってよいか?** 放置すると：「うちの部門だけで使う」で進み、後からデータ連携・認証・セキュリティ審査が必要とわかって作り直しになる	• **他システムとのデータ連携、利用者の範囲、扱うデータ（ GxP ・個人情報）のどれかに当てはまれば、部門に閉じた案件として扱わない** • 製品名ではなく「何を実現したいか」から聞き直す • 判定は受付の時点で GDS が行う	エンタープライズアーキテクチャ IT ポートフォリオ・需要管理 セキュリティガバナンス GxP システム管理（ CSV ） 個人情報・データ保護
② ソリューション選定 GDS が実現手段を選ぶ	**何をもって「良い選定」とするか?** 放置すると：機能比較だけで選び、効果が出ないと「 GDS が選んだから」となる	• **ファンクションが立てた効果目標を、最小のコストとリスクで満たす手段が良い選定** • 選定に入る前に、効果目標（ KPI と目標値）をビジネス要件に書いてもらう。目標がなければ選定に入らない • GDS は、コスト・納期・品質と選定の理由に責任を持つ	エンタープライズアーキテクチャ IT ソーシング・ベンダー管理 IT 財務管理 IT ポートフォリオ・需要管理
③ 意見が割れたとき ファンクションが推す製品・ベンダーと、 GDS の評価が異なる	**どちらの案を採るかを、何で決めるか?** 放置すると： GDS が反対するだけで止めていると受け取られるか、押し切られて標準外の製品が増える	• **要件への適合、総保有コスト、運用・セキュリティの負担の比較で決める** • 反対するときは代案と比較を示す。ファンクションの案を採るなら、追加費用と運用の分担を文書で合意する • 期限までに決着しなければ、選択肢を整理して新ガバナンスモデル（ Tier ）で決める	IT ガバナンス・リスク管理 エンタープライズアーキテクチャ IT ソーシング・ベンダー管理 IT 財務管理
④ 受け入れ システムが完成し、稼働を判断する	**「完成」を、誰が何で判断するか?** 放置すると：「思っていたものと違う」となり、追加開発と追加費用が出る	• **ファンクションが、提案依頼書の前に合意した受け入れ基準で判断する** • 受け入れ基準はビジネス要件から作る • 基準にない要望は変更として扱い、費用と納期への影響を示して決めてもらう	プロジェクト管理 テスト・リリース GxP システム管理（ CSV ） 変更・構成管理 サービスカタログ・サービスレベル管理

固定資産は、今後取得するものから GDS が持つ

既存の固定資産と長期前払費用は移さない。設備投資の予算も、予算移管の対象にしない
予算移管の時点では資産を移さない。新規案件を GDS が管理することで、年を追って管理の主体が GDS に移っていく

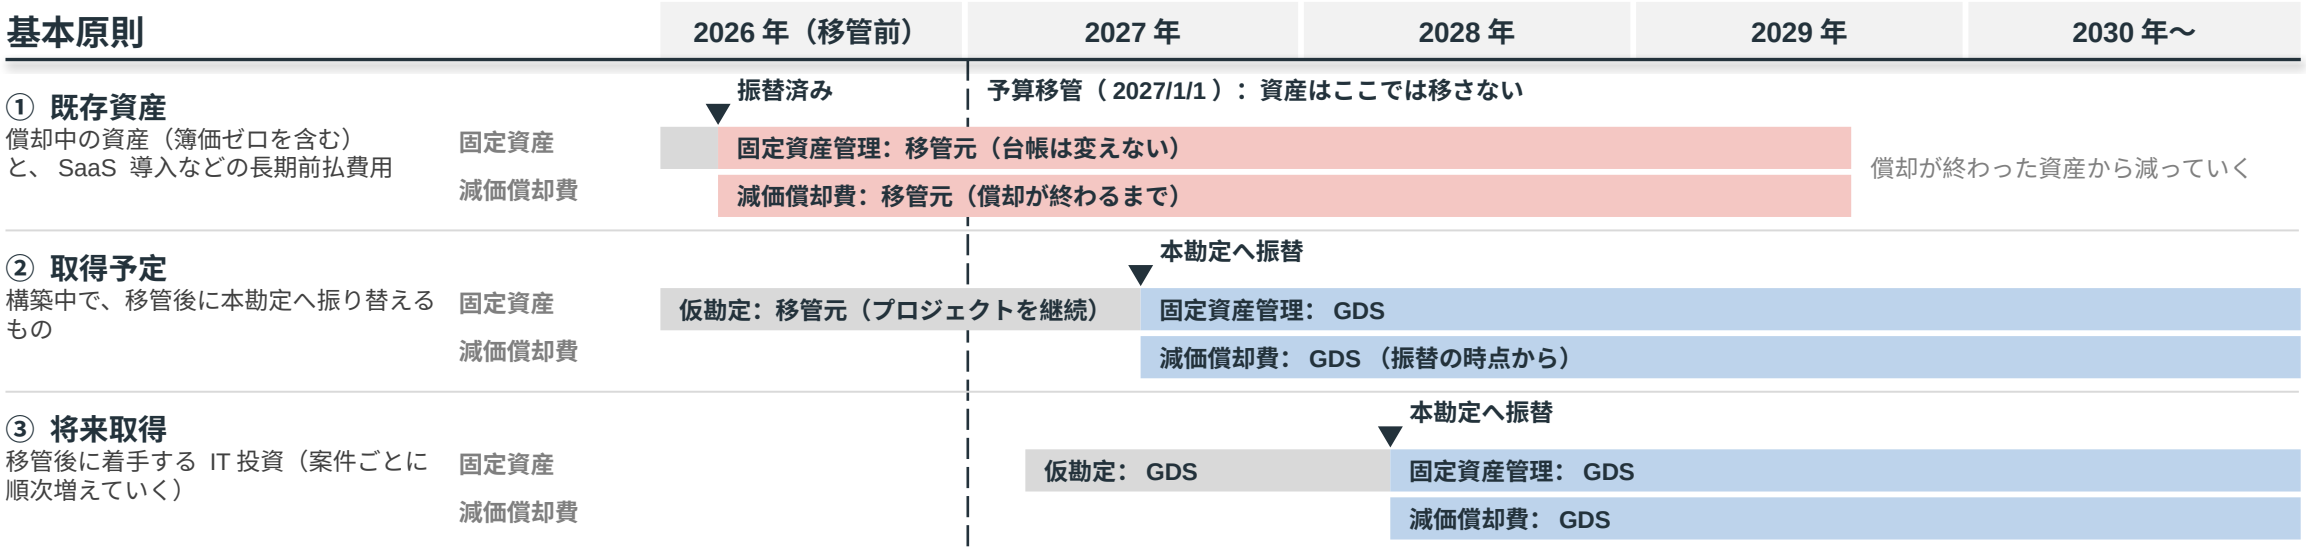

論点

既存資産の改修

移管後に、既存資産を改修するもの

推奨

前提：税務上、資本的支出（改修）は原則として、既存資産と同じ種類・耐用年数の資産を「新たに取得した」ものとして扱う

- 改修分は③と同じく GDS が持つ
- 本体は原則どおり移管元に残す

理由

- 改修も新しい投資。移管元に残すと「改修」と呼べば従来どおり投資できる抜け道になる
- 改修分は本体と別の資産として台帳に載るので、改修分を GDS にしても本体の台帳には手が入らない

気をつけること

- 除却・減損の判断は 2 者にまたがる。新ガバナンスモデルで GDS がリードし、移管元と合意して決める
- 作り直しに近く本体の簿価が大きい改修や、定率法で本体と合算している資産は、本体ごと移すかを財務経理と個別に決める

既存資産はそのまま。改修を含め、今後の IT 投資から GDS が管理する
