# IT予算移管 キックオフ

IT部門 全員向け説明

2026年11月2日　予算移管 進行役

# 最初にお答えしたいこと

懸念 1

**例外はあるのか。
手続きが要る業務まで
1月に移すのか**

## 例外はない。すべての予算を 2027年1月1日に一括で移す

- 個別移管や案件の保留はしない。移管は全社の方針として決定済み
- 今の担当が SOP・規程・職務分掌など承認済みの文書で定められ、変えるのに正式な手続き（例GxP の変更管理）が要る業務は、手続きが終わるまで今の担当が続ける（経過措置）
- 経過措置があっても予算は移る。その業務と完了予定は合意文書に残す

懸念 2

**移管の後、
誰が何を担うのか。
部門の権限は
どうなるのか**

## 最終責任（A）は部門に残る。役割分担は標準　RACI を基に合意する

- 間接業務（予算の管理、契約、発注・検収・支払い）は月から IT部門が担う
- 直接業務とIT関連業務のＡはビジネスオーナーに残る。IT部門はＡを引き取らない
- 案件ごとに変えられるのは、IT関連業務のＲ / Ｃ の持ち方と、IT部門がＲを担い始める時期だけ。移管元の責任者が合意文書を承認して確定する（6〜8枚目）

# 今期の目標

## 移管の稟議が、12月末までに承認されること

今期は12月末の移管の承認を目指す。移管による効果の創出は、来期に改めて検討する

### 決まっていること

**全社の方針として決定済み**

- 経営で決定済み。全社向けの予算策定ガイドラインに明記されている
- 対象は営業部門以外の部門（人事・総務・財務を含む）。各部門には案内済み
- 範囲は、業務アプリケーションとその関連ツールの予算・契約・間接業務
- インフラやセキュリティなど、全社横断の領域は含まない
- ビジネスオーナーシップは部門に残る

### すべて一括で移管する

**予算は 2027年1月1日に移る**

- 移すかどうかは判断しない
- **一括移管：2027年1月1日（すべての予算）**
- 経過措置：今の役割分担（Before）が SOP・規程・職務分掌など承認済みの文書や記録で定められ、変えるのに正式な手続き（例：GxP の変更管理）が要る業務は、手続きが終わるまで今の担当が続ける
- **経過措置があっても、予算は1月1日に移る**
- 経過措置の業務と完了予定は、合意文書に残す

### 12月末のゴール

**稟議の承認。すべて終わっていなくてよい**

**前提はこの 3つだけ**

① 稟議に必要な情報（移管判定、来年度予算、合意文書）が整理されている


② 終わっていないこと（SOPの改訂、契約の署名者の変更など）が案件ごとに明確になっている

③ 1月から契約の管理と支払いを IT部門が始められる

移管の時点で契約の手続きはしない。署名者は次回の更新から IT部門に変わり、請求書の宛名の変更は2月初旬までに相手先に連絡する

来年以降の役割分担は 6〜8枚目に参考として示した。今は予算移管に集中してほしい

# 11月～12月のタスク

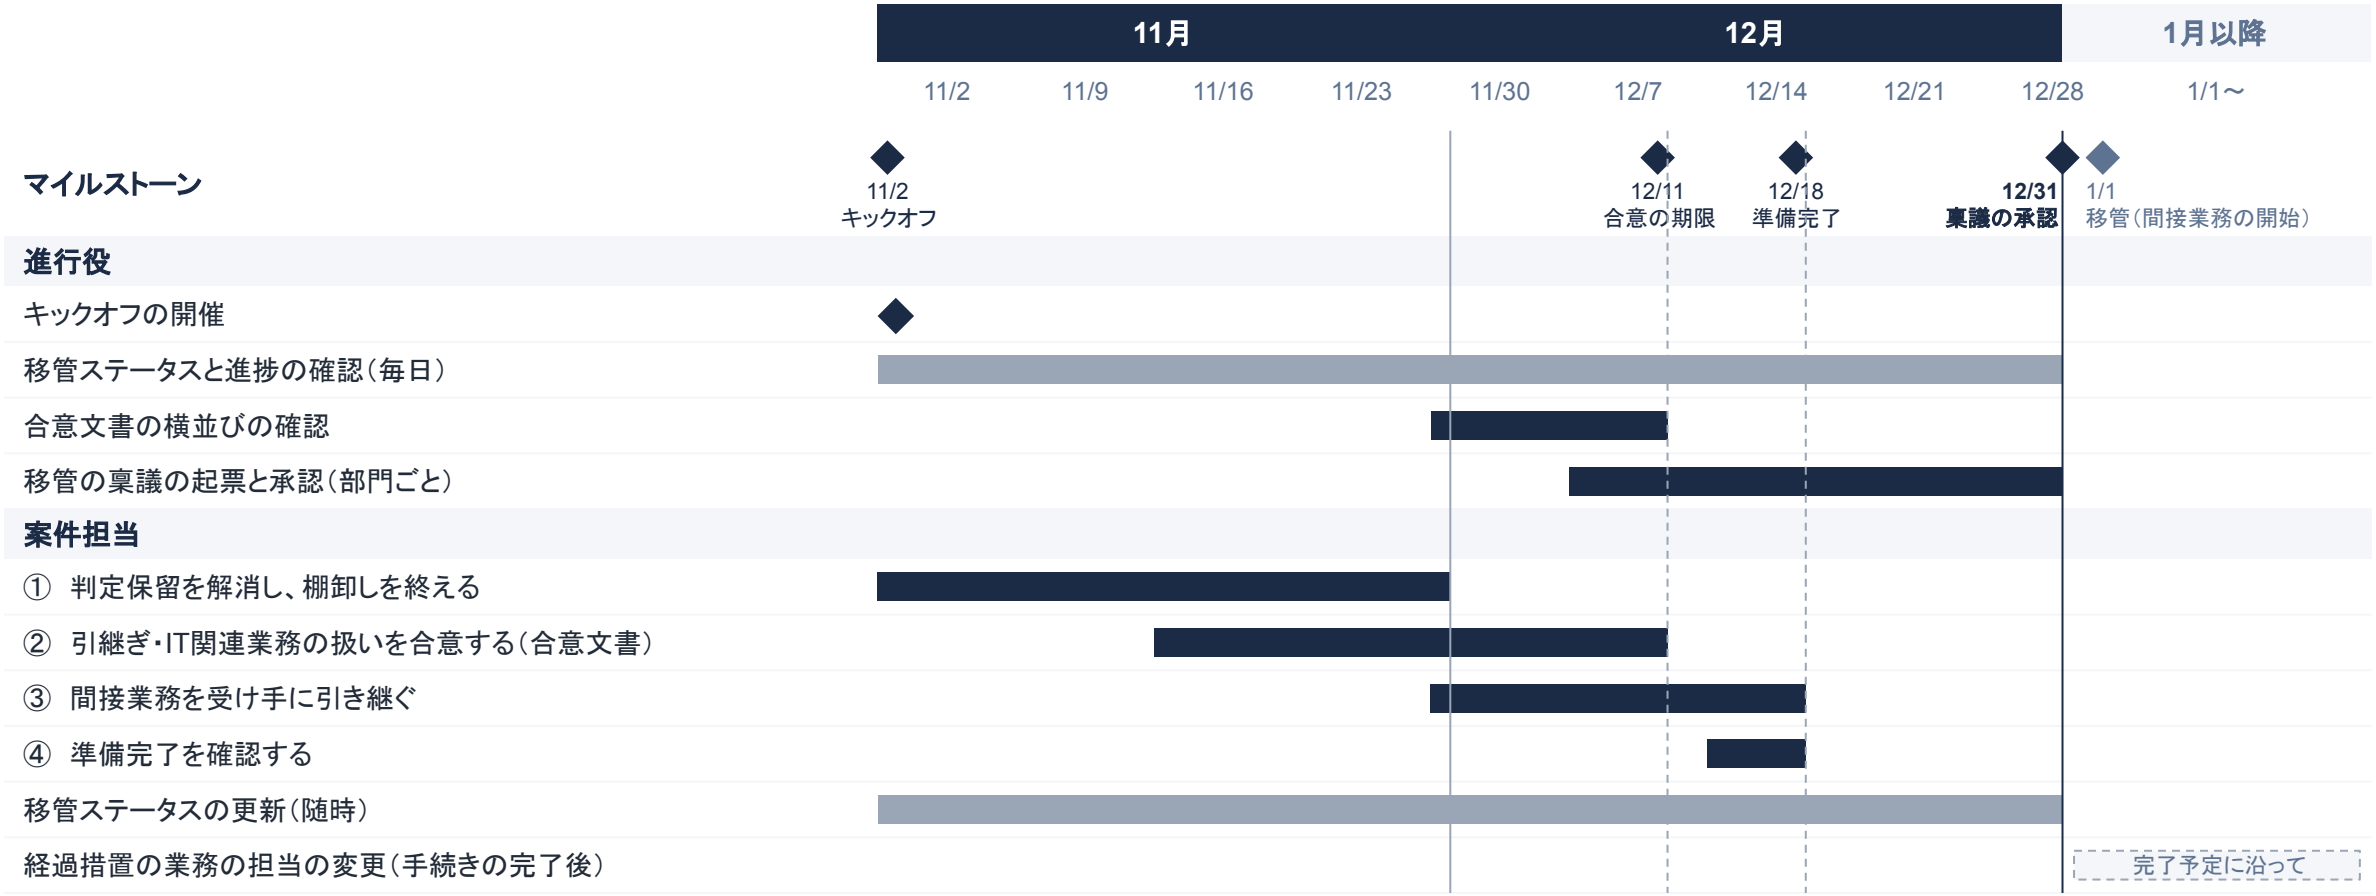


### 進行役（1名）

全体を進める。移管ステータスを毎日確認し、部門の案件のステータスが埋まったら移管の稟議を起票する。合意文書を横並びで確かめるIT部門長への依頼と相談は進行役が行う

### 案件担当（普段の窓口）

その案件でビジネス部門のカウンターパートを務めているIT部門のメンバーがそのまま担う。案件ごとの実務と、移管元の責任者への承認の依頼を行う（5枚目）

# 案件担当の手引き

## やること（4枚目のタスク①〜④）

### 1 判定保留を解消し、棚卸しを終える　11月中

記入内容を部門の担当者に確かめ、足りない入力を埋めて判定保留をなくす

**成果物**　部門の担当者が確認した予算移管シート（予算一覧・紐付け・システム・業務・契約）。判定保留がない状態／ ステータス → 棚卸し済み

### 2 引継ぎ・IT関連業務の扱いを合意する　12/11まで

RACI（7・8枚目）を案件に合わせてカスタマイズし、経過措置と引継ぎの方法を加えた合意文書を作り、移管元の責任者の承認を得る

**成果物**　承認された合意文書（カスタマイズしたRACI、経過措置と完了予定、引継ぎの方法。決定記録に登録）／ ステータス → 合意済み

### 3 間接業務を受け手に引き継ぐ　12/18まで

部門から手順・資料を受け取り、受け手に渡す

**成果物**　受け手に渡した資料一式（契約書の写し、請求の窓口、支払いの時期、未払いの請求）。担当の変更に手続きが要る業務（GxP など）は、その起票と完了予定

### 4 準備完了を確認する　12/18まで

準備完了チェックで、合意文書・引継ぎ・経過措置の手続きの起票を確かめる

**成果物**　準備完了チェックの記録 ／ ステータス → 準備完了

## お願いしたいこと

棚卸し中
↓
棚卸し済み
↓
合意済み
↓
**準備完了**

ほかに「対象外」がある

- 予算移管シートの移管ステータスを、条件を満たしたらその都度更新する
- 「進捗」シートの自分の行（タスクの状態と完了日）を更新する
- 「確認（自動）」欄に表示が出たら、ステータスを見直す（進行役が毎日確認して依頼する）
- 判定は数式で自動。手で書き換えず、直すのは入力
- 承認済みの文書で担当が定められた業務は、経過措置として合意文書に記録する
- 期限に間に合いそうにないときは、理由と見込みを早めに進行役に伝える

# 業務の3つの層と役割

**移すのは間接業務。 IT関連業務（中間層）は案件ごとに合意する。どの層でも、業務の最終責任（　　A）はビジネスオーナーに残る**

| | BO　ビジネスオーナー<br>部門長。業務プロセスと、業務アプリケーションの要否・目的・便益に最終責任を持つ | BU　ビジネス担当<br>部門の担当者。システムを使って業務を行い、要望を出し、受け入れを確かめる | SO　システムオーナー<br>IT部門。システムの可用性・保守・セキュリティに責任を持つ。A は引き取らない |
|---|---|---|---|
| **直接業務**<br>移さない | **A**<br>業務要件・受け入れを決める | **R**<br>システムを使った業務、要件の整理、受け入れの確認 | **C**<br>相談を受ける |
| **IT関連業務**<br>中間層。案件ごとに合意 | **A**<br>判断・承認（交渉不可） | **R / C**<br>要望と効果の説明 | **R**<br>実務を担う（投資：企画・見積の取得・申請書の作成／経費：運用のモニタリング、改善、契約の見直し） |
| **間接業務**<br>移す（これまでは部門が担当） | **I**<br>報告を受ける | **—**<br>関与しない | **A / R**<br>予算の管理、契約、発注・検収・支払い（1月から） |

**IT関連業務は、7・8枚目の RACI テンプレートを案件ごとにカスタマイズし、移管元の責任者と合意して文書に残す**

参照（GxP）：EU GMP Annex 11（2011年、2025年改訂案）、PIC/S PI 011-3、厚生労働省「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」
参照（内部統制）：金融庁「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準・実施基準」、経済産業省「システム管理基準 追補版（財務報告に係るIT統制ガイダンス）」「システム管理基準」

# RACI：IT投資プロセス（ Before → After）

BO：ビジネスオーナー（部門長） BU：部門担当 SO：システムオーナー（IT部門） R：実行 A：最終責任 C：相談 I：連絡

| 活動 | 層 | Before（現状） | | After（移管後） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BO | BU | BO | BU | SO |
| I-1 課題・ニーズの特定 | 直接 | A | R | A | R | C |
| I-2 業務要件の定義 | 直接 | A | R | A | R | C |
| I-3 解決策の検討（システム化の方針、既存システムとの整合） | IT関連 | A | R | A | C | R |
| I-4 ベンダー情報の収集・見積の取得 | IT関連 | A | R | A | C | R |
| I-5 投資効果と費用の算定（BU は効果、SO は費用） | IT関連 | A | R | A | R | R |
| I-6 予算要求・投資申請の作成 | IT関連 | A | R | A | C | R |
| I-7 投資の決裁 | — | A | R | 決裁者（新しいITガバナンス〈Tier〉で検討中） | | |
| I-8 ベンダーの選定 | IT関連 | A | R | A | C | R |
| I-9 契約の締結 | 間接 | A | R | I | | A/R |
| I-10 発注・検収・支払いの手続き | 間接 | A | R | | | A/R |
| I-11 プロジェクトの推進（進捗・品質） | IT関連 | A | R | A | R | R |
| I-12 受け入れ（業務要件を満たすか） | 直接 | A | R | A | R | C |
| I-13 効果の確認（事後評価） | IT関連 | A | R | A | R | C |

- Before：ビジネス側が単独で行っている状態（初版はパターン）。実際のBefore が違う案件は、書き直してから比べる
- After：IT部門が関与を強め、直接業務とIT関連業務のA はビジネスオーナーに残す。色付きのマスはBefore から変わるところ（空欄は関与しなくなる）
- 案件ごとのカスタマイズ：変えられるのはIT関連の行の BU と SO の R / C の持ち方と、SO が R を担い始める時期だけ。A の列と、直接・間接の行は変えない

# RACI：経費プロセス（ Before → After）

BO：ビジネスオーナー（部門長） BU：部門担当 SO：システムオーナー（IT部門） R：実行 A：最終責任 C：相談 I：連絡

| 活動 | 層 | Before（現状） | | After（移管後） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BO | BU | BO | BU | SO |
| E-1 システムを使った業務 | 直接 | A | R | A | R | |
| E-2 部門で行う運用（ユーザー・権限の管理） | 直接 | A | R | A | R | **C** |
| E-3 予算の計上・執行の管理 | 間接 | A | R | **I** | | **A/R** |
| E-4 契約の更新・変更・解約の手続き | 間接 | A | R | **C** | | **A/R** |
| E-5 請求書の受領・支払い | 間接 | A | R | | | **A/R** |
| E-6 委託先への指示・報告の受領（契約上の管理） | 間接 | A | R | | | **A/R** |
| E-7 運用状況のモニタリング（SLA・障害・利用状況） | **IT関連** | A | R | A | **C** | **R** |
| E-8 改善活動（BU は要望、SO は整理と実施） | **IT関連** | A | R | A | R | **R** |
| E-9 契約の見直しに向けた活動（利用実態・ライセンス数・代替案の評価、更新の判断） | **IT関連** | A | R | A | **C** | **R** |
| E-10 ベンダーの評価 | **IT関連** | A | R | A | **C** | **R** |
| E-11 GxP の変更管理 | **IT関連** | A | R | A | R | **R** |

- Before：ビジネス側が単独で行っている状態（初版はパターン）。実際のBefore が違う案件は、書き直してから比べる
- After：IT部門が関与を強め、直接業務とIT関連業務のA はビジネスオーナーに残す。色付きのマスはBefore から変わるところ（空欄は関与しなくなる）
- 案件ごとのカスタマイズ：変えられるのはIT関連の行のBU とSO の R / C の持ち方と、SO が R を担い始める時期だけ。A の列と、直接・間接の行は変えない
- E-11 には、本来は品質保証部門の関与が要る（この表では省いている）
