IT投資ガバナンス新体制
審議プロセスの変更

変更の背景にある考え方を理解し、
IT部門全員で変革に取り組むために

IT投資委員会事務局　｜　施行日：未定

本日の内容

1

変更点の確認

会議体とプロセスは、何が、どのように変わるのか

2

起案者の実務

起案者として、何を、どのように行えばよいか

3

事務局の整備

事務局が、何を、どのように整備しているか

説明

IT投資委員会事務局

対象

IT部門と事業部門の実務者

CHAPTER 1

変更点の確認

何が、どのように変わるのか

・会議体の変更

・プロセスの変更（優先順位・予算計上まで／実行計画の審議から実行まで）


・そのほかの変更

変更前後の比較①：会議体


変更前		変更後	
DIB	**承認者**：役員レベル **対象**：50百万円以上の投資計画（年1回、予算編成前） **目的**：予算計上の是非	→ **Tier1**	**参加者**：C-suite **対象**：1億円を超える案件 **決定**：優先順位（年次）・優先度（随時） **開催**：年1回（11月ごろ）＋随時
ICTB（ローカル）	**承認者**：IT部門責任者 **対象**：単一の国・地域に閉じた案件 **目的**：実行計画の承認	→ **Tier2**	**参加者**：C-suiteの1つ下のシニアマネジメント **対象**：1億円以下の案件の優先順位・優先度、優先度が付いた全案件の実行計画 **決定**：優先順位・優先度（1億円以下）、決裁の振り分け、実行計画の承認・否認 **開催**：年1回＋随時＋毎月
ICTB（グローバル）	**承認者**：IT部門責任者 **対象**：2つ以上の国・地域にまたがる案件 **目的**：実行計画の承認（実態はローカルと同じ）	→ **Tier2**	
		Tier3（新設）	**参加者**：固定メンバーなし（EAの統括責任者・各領域責任者が主催し招集） **対象**：Tier2が要請した実行計画 **決定**：推奨案をTier2へ報告（承認・否認は決めない） **開催**：随時（Tier2の要請時）
事業部門内の承認会議	**承認者**：各事業部門 **対象**：事業部門予算の案件（IT投資の大半） **目的**：自部門予算によるIT投資の承認（共通ルールなし）	→ **承認会議（ローカル）**	**参加者**：起案者の所属部門（事業部門またはIT部門）の承認会議 **対象**：Tier2が決裁を委ねた案件（事業部門・IT部門のどちらの起案も対象） **決定**：実行計画の承認・否認（結果を事務局へ報告）

変更前後のプロセス①：優先順位・予算計上まで

変更前

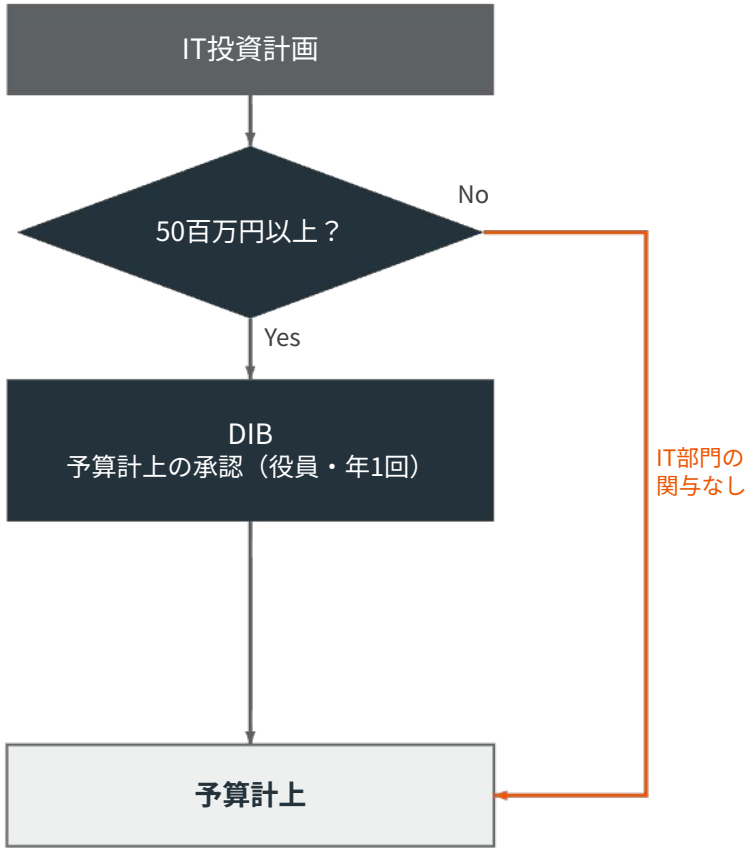

変更後

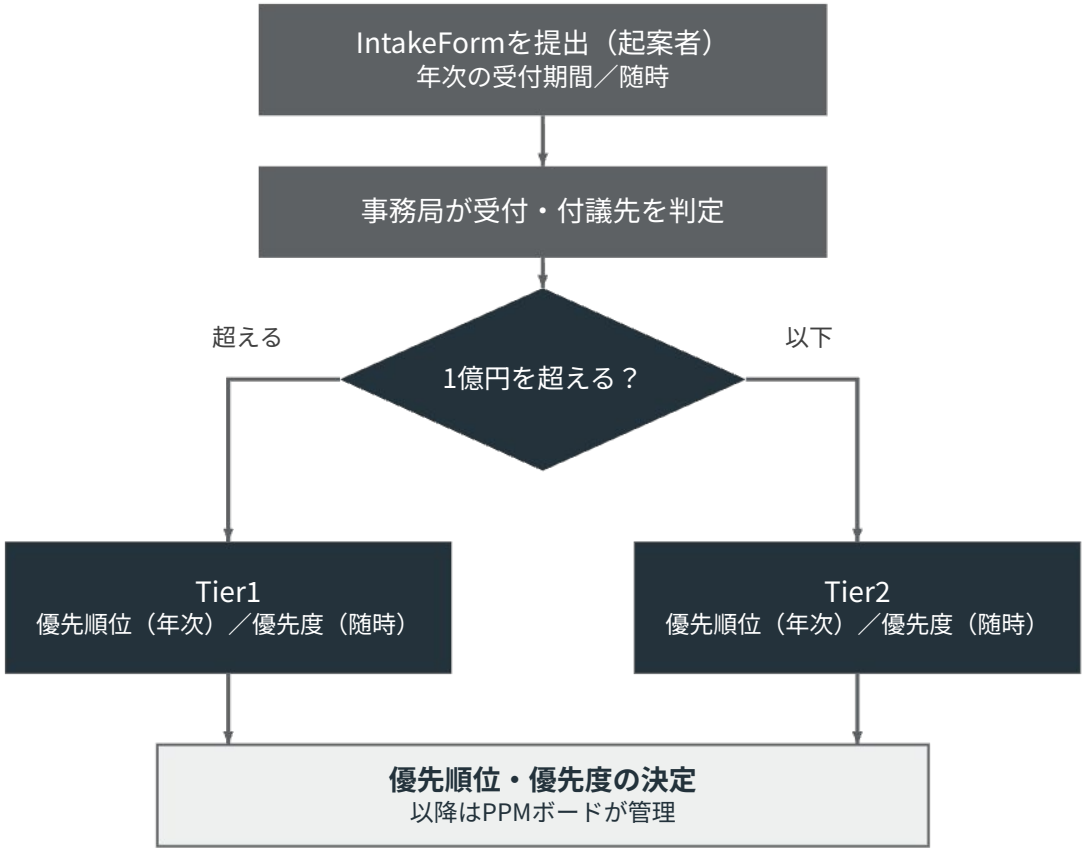


優先順位：年次の会議で案件どうしを比べて付ける順位　**優先度**：随時の受付で、実行計画の審議に進めてよいかの判断（あり／なし）

イベント　　課題箇所（IT部門の関与なし）


変更前後のプロセス②：実行計画の審議から実行まで

変更前

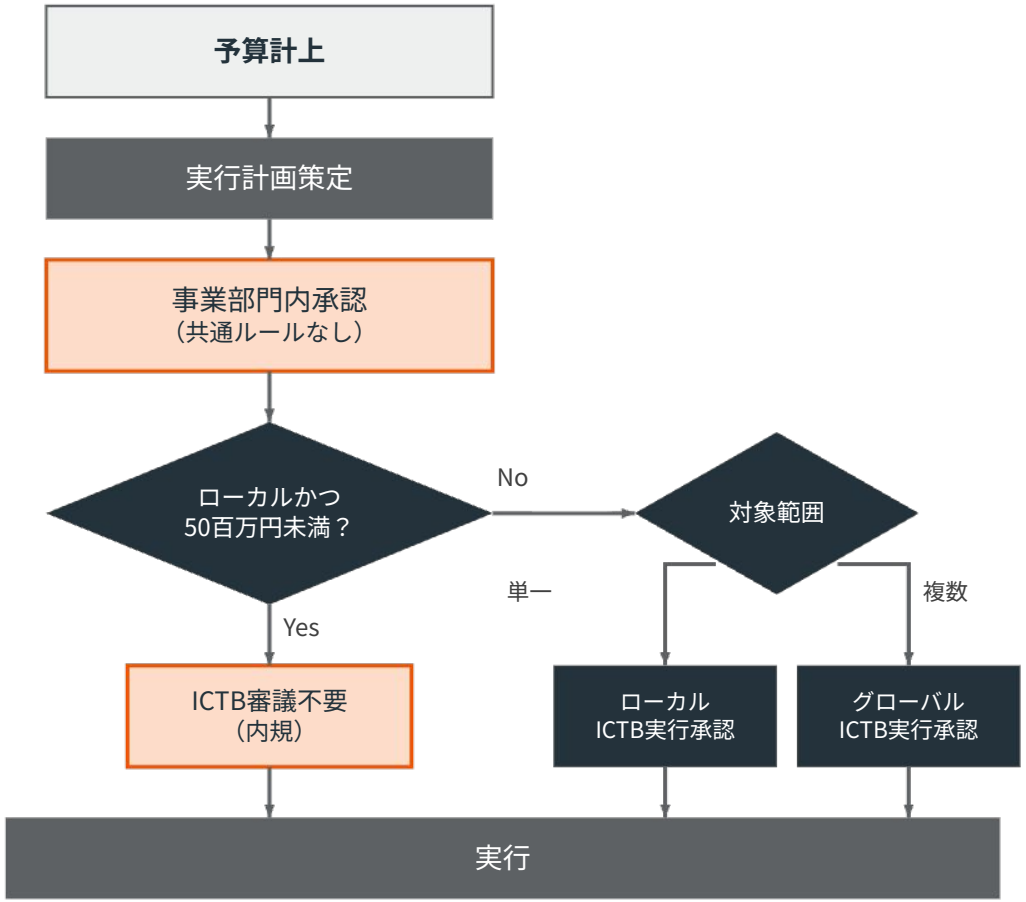

イベント　課題箇所　条件付きの経路

変更後

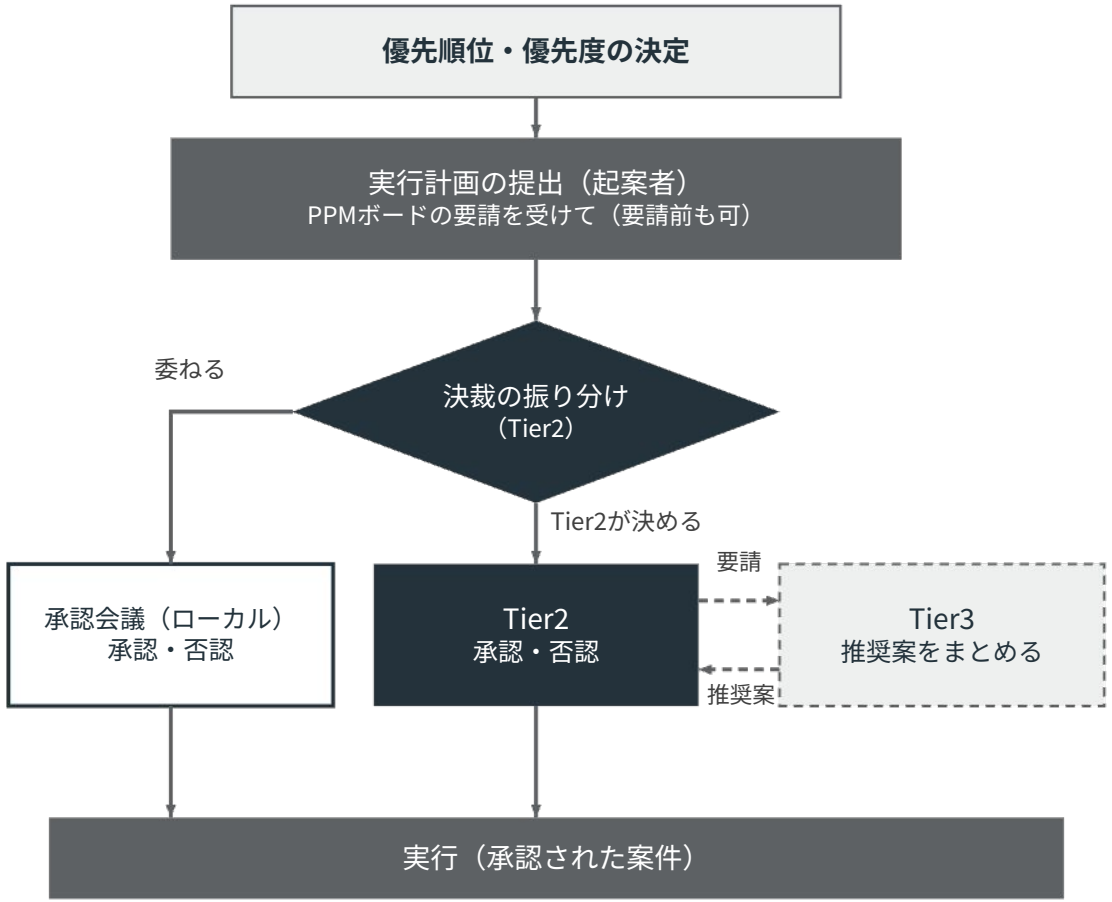

※決裁の振り分けの判断基準（Tier3を招集する条件、承認会議（ローカル）に委ねる条件）は未定。承認会議（ローカル）に委ねた案件の結果は事務局に報告する。

変更前後の比較③：そのほか

観点	変更前	変更後
審議の観点	DIB：予算計上の是非／ICTB：実行計画の承認	優先順位・優先度の審議（Tier1・Tier2）と実行計画の審議（Tier2）の2段階。アーキテクチャの視点はTier3が推奨案としてTier2に報告する
金額基準	DIBは50百万円以上が対象。50百万円未満のローカル案件は、内規によりICTBの審議なしに実行できる	金額にかかわらず、全てのIT投資案件がTier1またはTier2の審議対象。1億円を超えるかどうかで付議先を分ける
IT部門の関与	50百万円未満はIT部門の関与なしに予算計上される	全案件がIntakeFormで事務局に届き、Tier1またはTier2で審議される
実行承認の経路	事業部門内承認 → ICTB の二重審議	実行計画はTier2が受け、案件ごとに決裁を振り分ける（Tier2が決める／Tier3の推奨案を受けて決める／承認会議（ローカル）に委ねる）
地域による区分	ローカル／グローバルICTB（実態は同じ）	区分は設けない。アーキテクチャの観点はTier3が担う
受付の窓口	事業部門向けとICTB向けに、別々に資料を作成する	年次・随時とも、共通のIntakeFormで受け付ける
年次予算	年次予算は策定後、期中に見直さない	年次の予算策定のイベント（11月ごろ）で優先順位を付ける。年次以外の時期の予算の追加は、原則として認めない

CHAPTER 2

起案者の実務

起案者として、何を、どのように行えばよいか


・起案者のための5ステップ

・Intakeプロセスと定常プロセス

・提出に向けた準備

・審議結果に応じたネクスト・アクション

起案者のための5ステップ・路線図



Step 1

IntakeFormの提出

（Actor：起案者）

年次の受付期間、または随時に提出する。

Step 2

受付と振り分け

（Actor：事務局）

事務局が内容を確認し、金額で付議先（Tier1／Tier2）を判定する。不備があれば差し戻す。

Step 3

優先順位の審議

（Actor：Tier1／Tier2）

限られた予算枠の中で、優先順位（随時は優先度）を決定する。

Step 4

実行計画の審議

（Actor：起案者／Tier2）

PPMボードの要請を受け、起案者が実行計画を提出する。Tier2が承認・否認（または振り分け）を決定する。


Step 5

結果の通知

（Actor：事務局）

各段階の結果を事務局が起案者に通知し、次に行うことを案内する。


Intakeプロセス（BPMN）：随時の優先度の決定まで

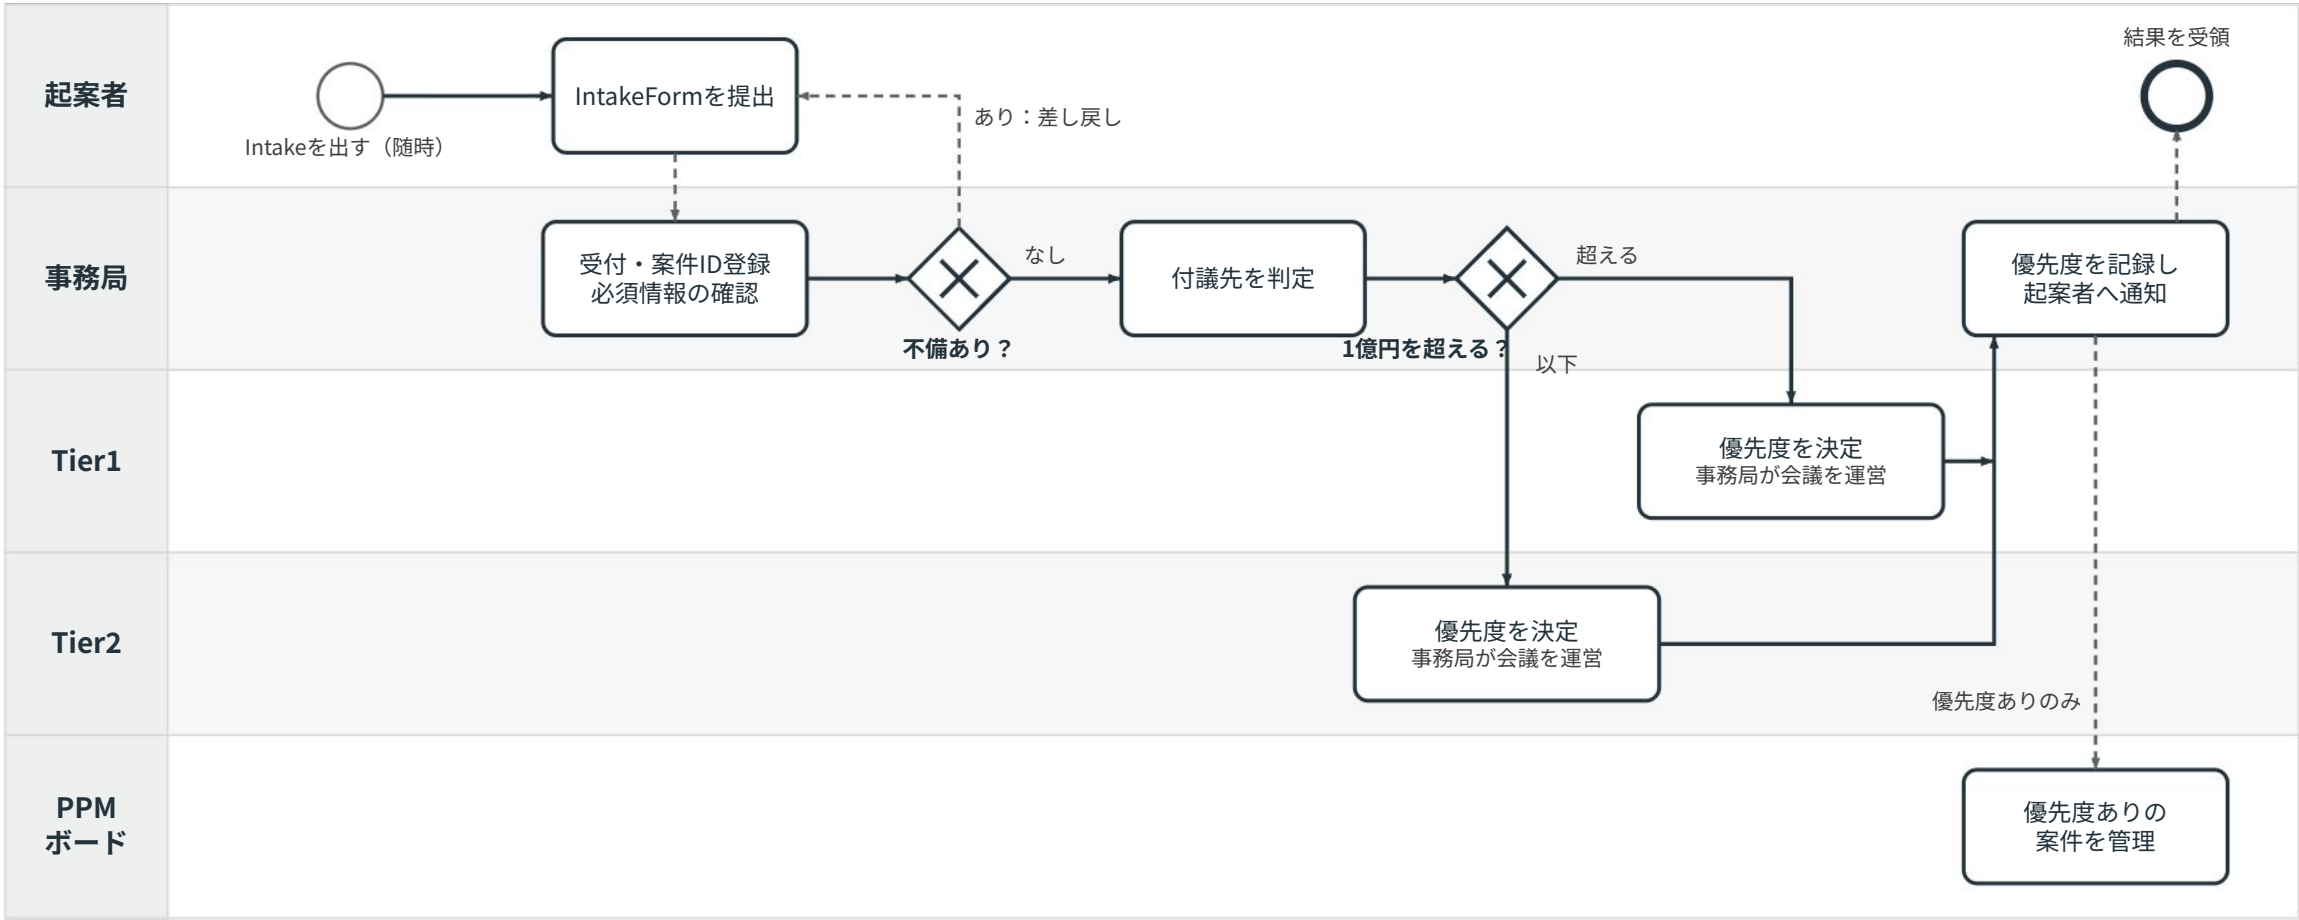

随時のIntakeは、年次の予算策定のイベントとは別に、常時受け付ける。Tier1は1億円を超える案件、Tier2は1億円以下の案件を審議する。年次のIT投資予算への追加は、原則として認められない。

開始／終了イベント　タスク　排他ゲートウェイ　順序フロー　メッセージフロー

定常プロセス（BPMN）：実行計画の審議

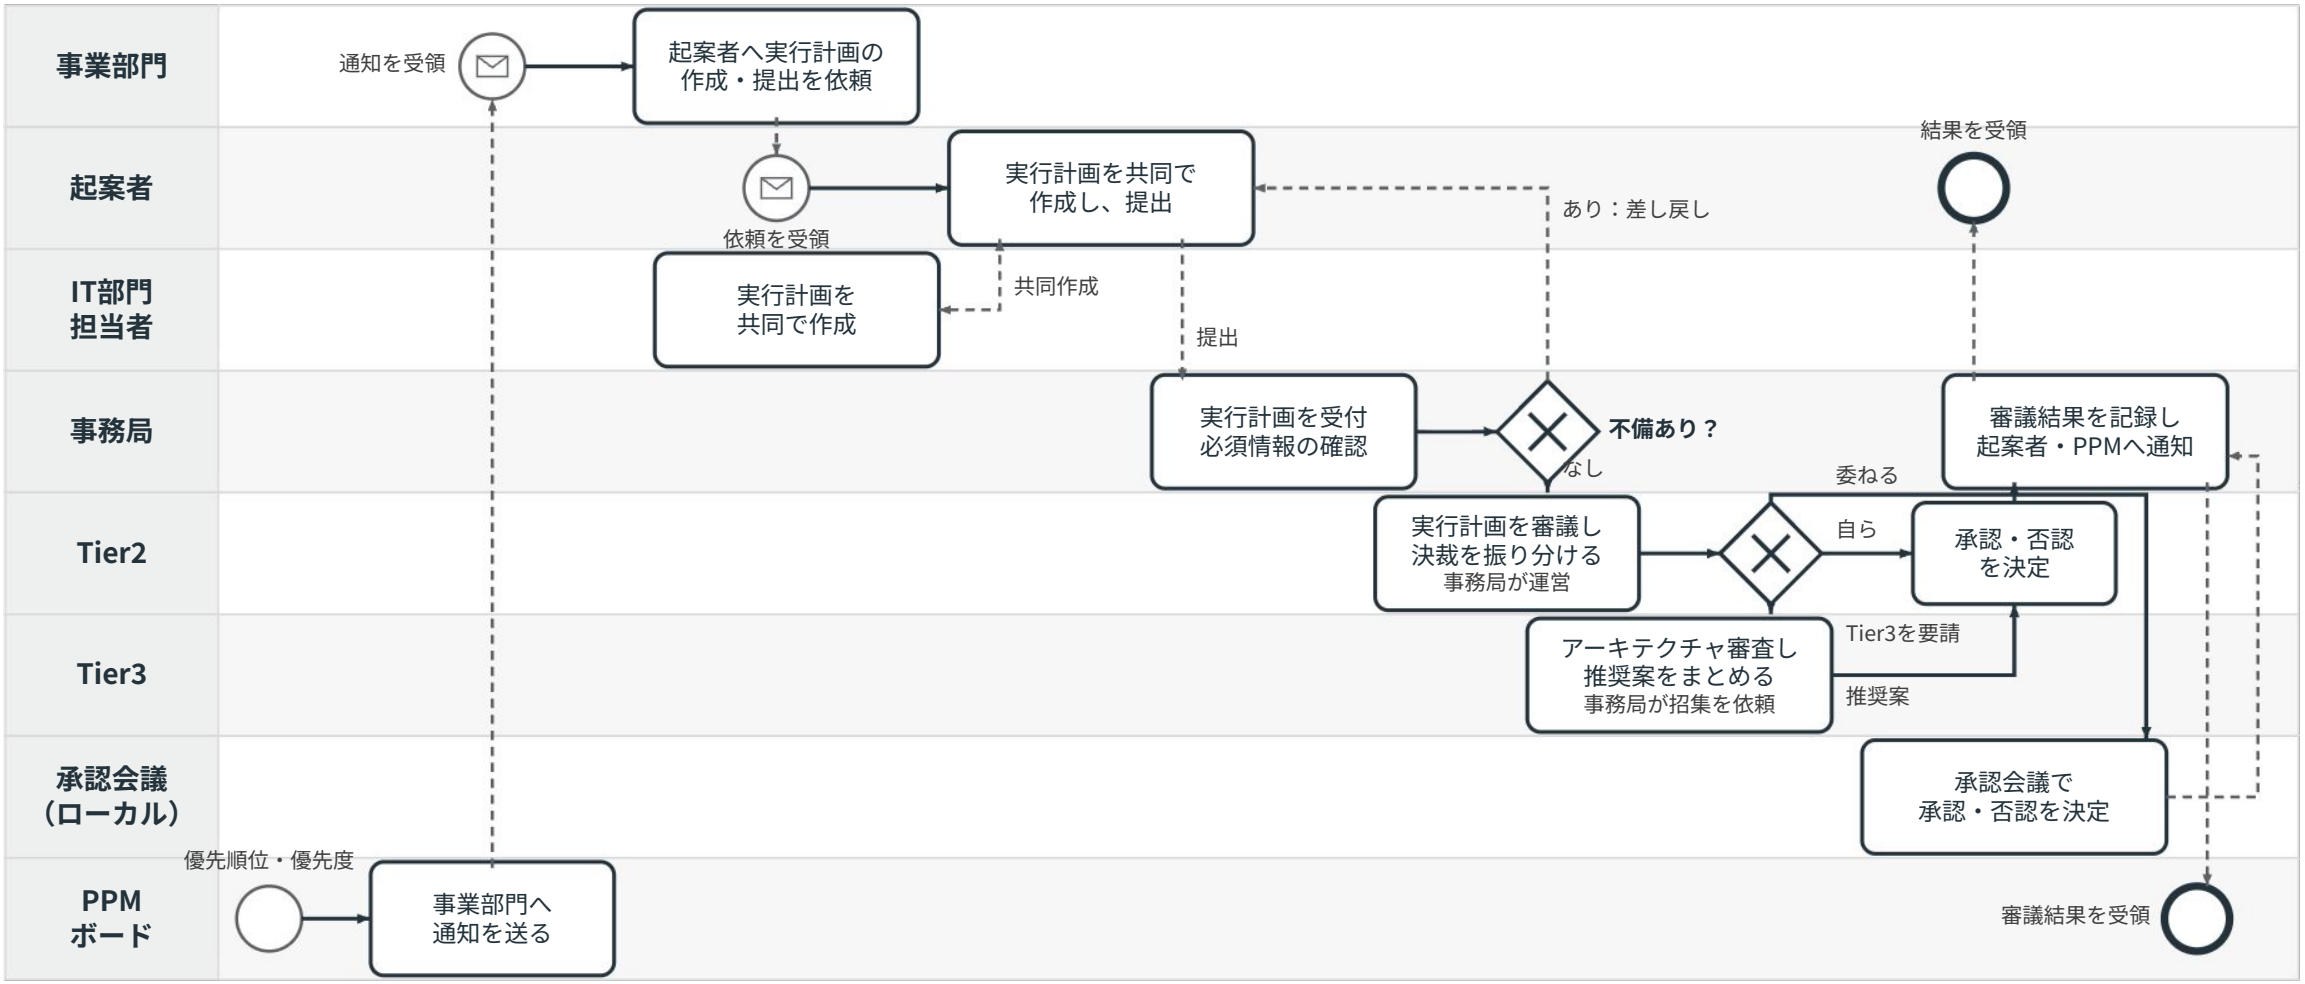

※IT部門が起案する案件も同様（「事業部門」のレーンを、起案者の所属部門であるIT部門に読み替える）。振り分けの判断基準と否認時の再提出の扱いは未定。

開始／終了イベント　タスク　排他ゲートウェイ　順序フロー　メッセージフロー

提出に向けた準備

IntakeFormの準備（優先順位の審議用）

- **提出時期：**随時（年次の予算策定とは別に、いつでも提出できる）
- **重要ポイント：**1億円を超えるかどうかで審議先が変わるため、金額は算定方法に沿って内訳つきで正確に記入すること。


様式の所在：未定
提出先：未定
必須記入項目：未定

実行計画の準備（実行の審議用）

- **提出時期：**優先順位の確定後、PPMボードから提出の要請を受けたとき（要請前の自主的な提出も可）。
- **重要ポイント：**承認された実行計画に沿って案件が進むため、アーキテクチャや投資対効果の極めて詳細な根拠が求められる。

必須の情報：未定
提出形式：未定

審議結果に応じたネクスト・アクション

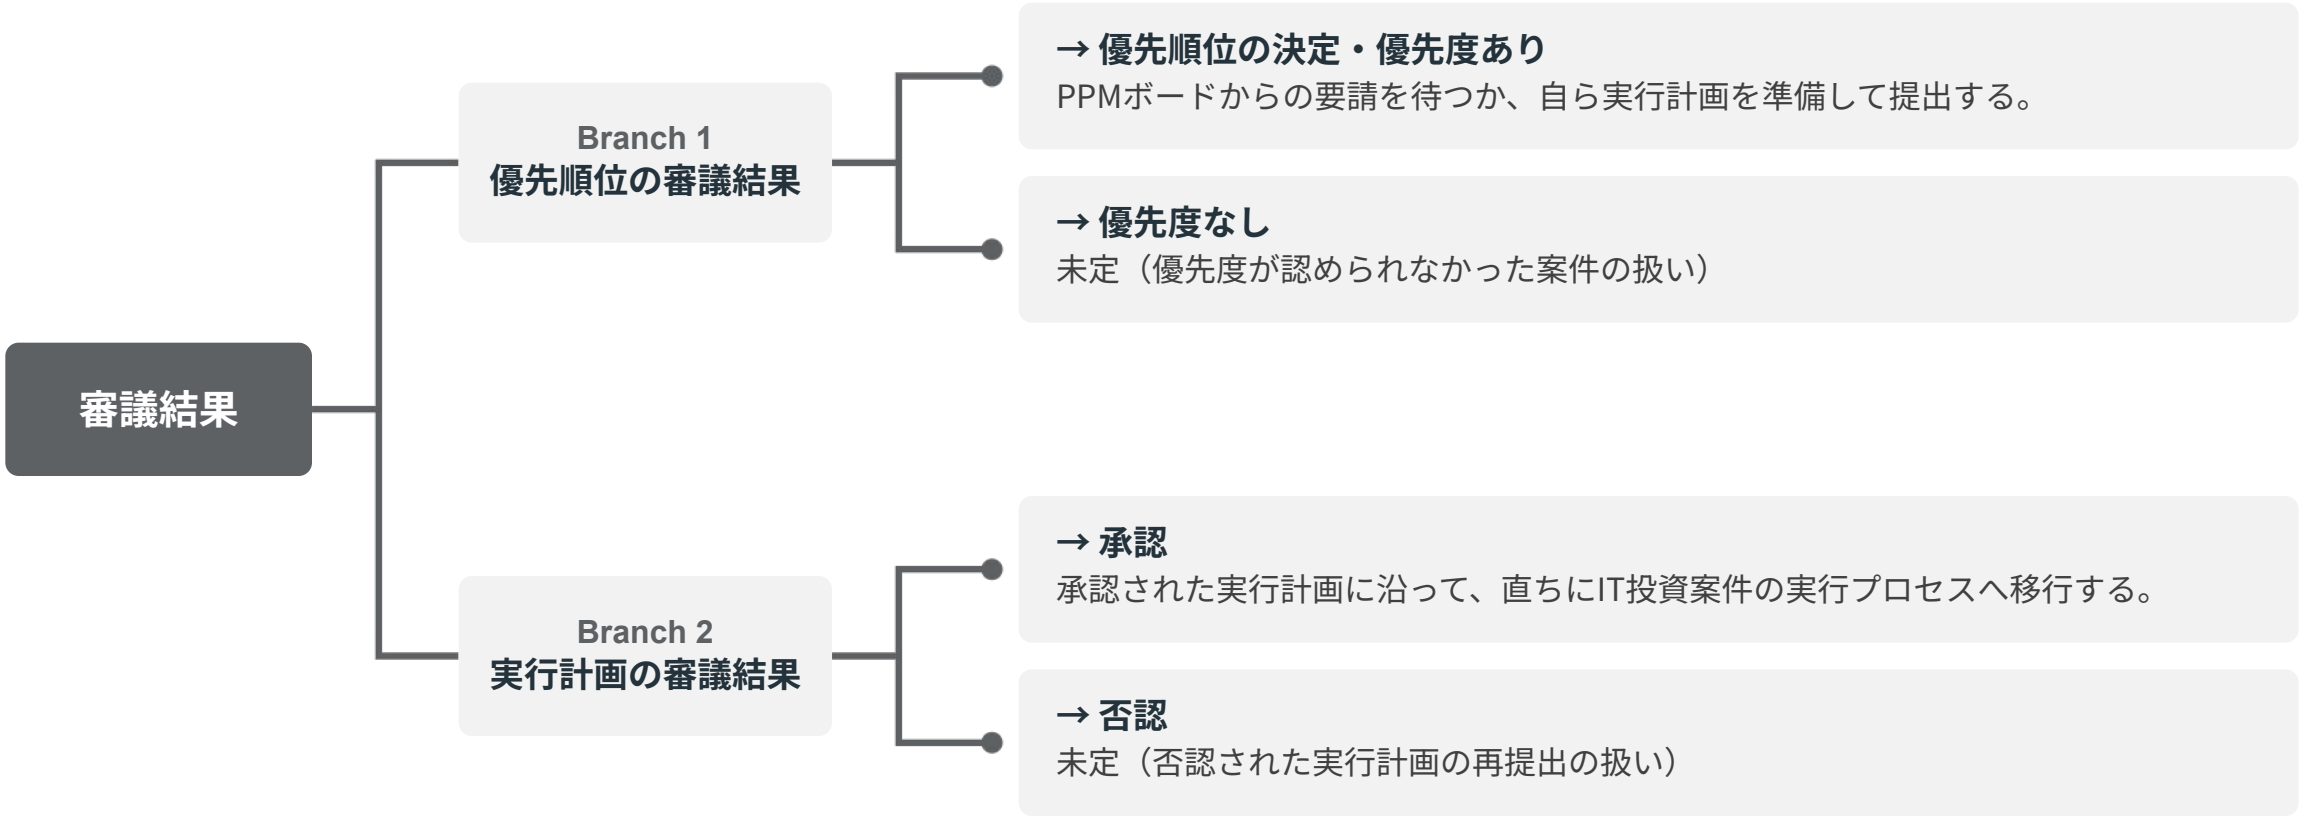

よくある間違い

- 優先順位が付いていない状態で、いきなり実行計画を出さないこと（必ずIntakeFormから開始）。
- 年次以外の時期に「予算の追加」を前提とした無計画な起案を行わないこと。

CHAPTER 3

事務局の整備

IT投資委員会事務局が、何を、どのように整備しているか

・事務局の責務

・関連ドキュメントの構造と目的

・新体制への移行スケジュールとサポート窓口

・初年度の年間スケジュール

IT投資委員会事務局：プロセスを回す「ハブ」としての責務

すること（What We Do）

- ✓ **受付と一次チェック：**IntakeFormや実行計画を受け付け、要件不足・不備があれば差し戻す。
- ✓ **会議の円滑な運営：**Tier1・Tier2の議題整理、資料準備、議事録作成を担う。
- ✓ **連携のブリッジ：**Tier2の振り分けに基づき、Tier3への招集依頼や承認会議（ローカル）への委任伝達を行う。
- ✓ **記録と通知：**すべての決定を案件台帳・決定記録に登録し、起案者とPPMボードへ速やかに通知する。

しないこと（What We Don’t Do）

- – **案件の優先順位・優先度、実行計画の「可否」を決定すること。**（決定権は会議体にのみ存在）
- – **Tier3会議そのものを運営すること。**（Tier3の主催者が独自に運営）
- – **IT投資予算の総額を決定すること。**（ファイナンス部門の役割）
- – **優先順位が付いた後の案件をトラッキング・管理すること。**（PPMボードの役割）

関連ドキュメントの構造と目的

規範（何を定めるか）

憲章
・目的・範囲・役割と責任、会議体の定め

運用基準
・対象・付議先の判定
・提出要件・判断の区分

決裁権限表
・誰が何をどの条件で決裁するか

用語集
・用語の定義、旧制度の用語との対応

プロセス（どう運用するか）

業務フロー定義
・全体の流れ・受け渡し
・RACI

Runbook
・事務局の作業手順
・例外対応

起案者ガイド
・起案者向けの流れ
・書き方・締切

記録（何を残すか）

決定記録
・決定事項と未確定事項

審議議案の記録
・議題と審議資料
・案件ごとの付議先・状況

議事録
・審議内容と決定事項
・議長の確認を経て保管

新体制への移行スケジュールとサポート窓口

11月某日：
Tier1・Tier2による優先順位の審議を開始

12月某日（来期予算の確定・本運用の開始）：
PPMが各起案者へ実行計画の提出期限を発信

1月～：
Tier2で実行計画の審議を開始

随時（Intakeオープン）：
年次予算にない案件が見込まれたら順次申請

これから決まる主な事項（順次アナウンス）

決裁の振り分け基準／IT投資案件の定義／金額の算定方法／IntakeForm・実行計画の様式／優先度なし・否認の扱い

迷ったときは、提出の前に事務局へご相談ください

窓口：IT投資委員会事務局

連絡先：未定

受付時間：未定

初年度の年間スケジュール（2026年11月～2027年12月）



イベント　開催　適宜（開催しない月もある）　期間・常時　適宜の開催期間　本運用の開始
