IT 予算移管 キックオフ

IT 部門 全員向け説明

2026 年 11 月 2 日　予算移管 進行役

最初にお答えしたいこと

懸念 1

**例外はあるのか。
手続きが要る業務まで
1 月に移すのか**

例外はない。すべての予算を 2027 年 1 月 1 日に一括で移す

- 個別移管や案件の保留はしない。移管は全社の方針として決定済み
- 今の担当が SOP ・規程・職務分掌など承認済みの文書で定められ、変えるのに正式な手続き（例: GxP の変更管理）が要る業務は、手続きが終わるまで今の担当が続ける（経過措置）
- 経過措置があっても予算は移る。その業務と完了予定は合意文書に残す

懸念 2

**移管の後、
誰が何を担うのか。
部門の権限は
どうなるのか**

最終責任（ A ）は部門に残る。役割分担は標準 RACI を基に合意する

- 間接業務（予算の管理、契約、発注・検収・支払い）は 1 月から IT 部門が担う
- 直接業務と IT 関連業務の A はビジネスオーナーに残る。 IT 部門は A を引き取らない
- 案件ごとに変えられるのは、 IT 関連業務の R / C の持ち方と、 IT 部門が R を担い始める時期だけ。移管元の責任者が合意文書を承認して確定する（ 6 〜 8 枚目）

今期の目標

移管の稟議が、 12 月末までに承認されること

今期は 12 月末の移管の承認を目指す。移管による効果の創出は、来期に改めて検討する

決まっていること

全社の方針として決定済み

- 経営で決定済み。全社向けの予算策定ガイドラインに明記されている
- 対象は営業部門以外の部門（人事・総務・財務を含む）。各部門には案内済み
- 範囲は、業務アプリケーションとその関連ツールの予算・契約・間接業務
- インフラやセキュリティなど、全社横断の領域は含まない
- ビジネスオーナーシップは部門に残る

すべて一括で移管する

予算は 2027 年 1 月 1 日に移る

- 移すかどうかは判断しない
- **一括移管： 2027 年 1 月 1 日（すべての予算）**
- 経過措置：今の役割分担（ Before ）が SOP ・規程・職務分掌など承認済みの文書や記録で定められ、変えるのに正式な手続き（例: GxP の変更管理）が要る業務は、手続きが終わるまで今の担当が続ける
- **経過措置があっても、予算は 1 月 1 日に移る**
- 経過措置の業務と完了予定は、合意文書に残す

12 月末のゴール

稟議の承認。すべて終わっていなくてよい

前提はこの 3 つだけ

① 稟議に必要な情報（移管判定、来年度予算、合意文書）が整理されている


② 終わっていないこと（ SOP の改訂、契約の署名者の変更など）が案件ごとに明確になっている

③ 1 月から契約の管理と支払いを IT 部門が始められる

移管の時点で契約の手続きはしない。署名者は次回の更新から IT 部門に変わり、請求書の宛名の変更は 2 月初旬までに相手先に連絡する

来年以降の役割分担は 6 〜 8 枚目に参考として示した。今は予算移管に集中してほしい

11 月〜 12 月のタスク

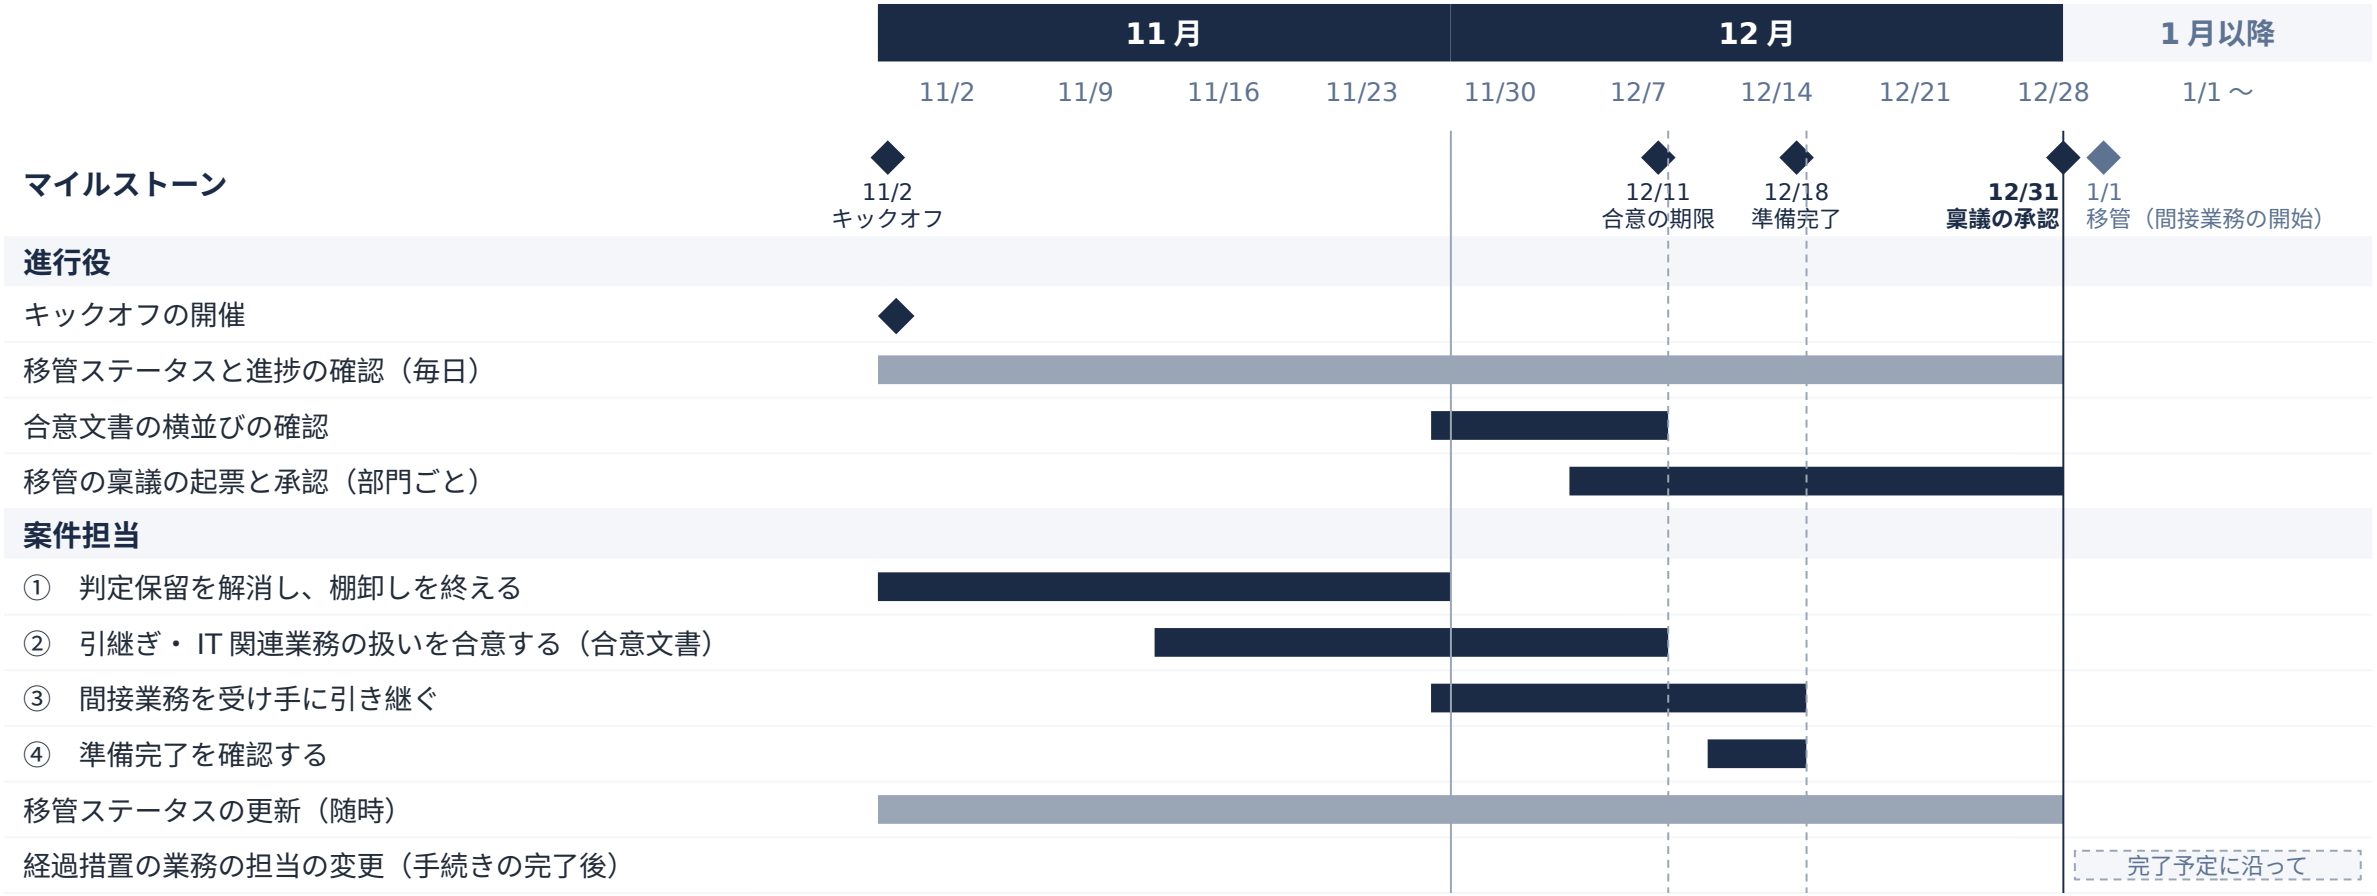

進行役（ 1 名）

全体を進める。移管ステータスを毎日確認し、部門の案件のステータスが埋まったら移管の稟議を起票する。合意文書を横並びで確かめる。 IT 部門長への依頼と相談は進行役が行う

案件担当（普段の窓口）

その案件でビジネス部門のカウンターパートを務めている IT 部門のメンバーがそのまま担う。案件ごとの実務と、移管元の責任者への承認の依頼を行う（ 5 枚目）

案件担当の手引き

やること（４枚目のタスク①〜④）

1 判定保留を解消し、棚卸しを終える　11 月中

記入内容を部門の担当者に確かめ、足りない入力を埋めて判定保留をなくす

成果物　部門の担当者が確認した予算移管シート（予算一覧・紐付け・システム・業務・契約）。判定保留がない状態　／　ステータス → 棚卸し済み

2 引継ぎ・ IT 関連業務の扱いを合意する　12/11 まで

RACI （７・８枚目）を案件に合わせてカスタマイズし、経過措置と引継ぎの方法を加えた合意文書を作り、移管元の責任者の承認を得る

成果物　承認された合意文書（カスタマイズした RACI 、経過措置と完了予定、引継ぎの方法。決定記録に登録）　／　ステータス → 合意済み

3 間接業務を受け手に引き継ぐ　12/18 まで

部門から手順・資料を受け取り、受け手に渡す

成果物　受け手に渡した資料一式（契約書の写し、請求の窓口、支払いの時期、未払いの請求）。担当の変更に手続きが要る業務（ GxP など）は、その起票と完了予定

4 準備完了を確認する　12/18 まで

準備完了チェックで、合意文書・引継ぎ・経過措置の手続きの起票を確かめる

成果物　準備完了チェックの記録　／　ステータス → 準備完了

お願いしたいこと



ほかに「対象外」がある

- 予算移管シートの移管ステータスを、条件を満たしたらその都度更新する
- 「進捗」シートの自分の行（タスクの状態と完了日）を更新する
- 「確認（自動）」欄に表示が出たら、ステータスを見直す（進行役が毎日確認して依頼する）
- 判定は数式で自動。手で書き換えず、直すのは入力
- 承認済みの文書で担当が定められた業務は、経過措置として合意文書に記録する
- 期限に間に合いそうにないときは、理由と見込みを早めに進行役に伝える

業務の 3 つの層と役割

移すのは間接業務。 IT 関連業務（中間層）は案件ごとに合意する。どの層でも、業務の最終責任（ A ）はビジネスオーナーに残る

	BO　ビジネスオーナー 部門長。業務プロセスと、業務アプリケーションの要否・目的・便益に最終責任を持つ	BU　ビジネス担当 部門の担当者。システムを使って業務を行い、要望を出し、受け入れを確かめる	SO　システムオーナー IT 部門。システムの可用性・保守・セキュリティに責任を持つ。 A は引き取らない
直接業務 移さない	**A** 業務要件・受け入れを決める	**R** システムを使った業務、要件の整理、受け入れの確認	**C** 相談を受ける
IT 関連業務 中間層。案件ごとに合意	**A** 判断・承認（交渉不可）	**R / C** 要望と効果の説明	**R** 実務を担う（投資：企画・見積の取得・申請書の作成／経費：運用のモニタリング、改善、契約の見直し）
間接業務 移す（これまでは部門が担当）	**I** 報告を受ける	**—** 関与しない	**A / R** 予算の管理、契約、発注・検収・支払い（ 1 月から）

IT 関連業務は、 7 ・ 8 枚目の RACI テンプレートを案件ごとにカスタマイズし、移管元の責任者と合意して文書に残す

RACI： IT 投資プロセス（ Before → After ）

BO： ビジネスオーナー（部門長）　BU： 部門担当　SO： システムオーナー（ IT 部門）　　R： 実行　A： 最終責任　C： 相談　I： 連絡

活動	層	Before （現状）		After （移管後）		
		BO	BU	BO	BU	SO
I-1　課題・ニーズの特定	直接	A	R	A	R	**C**
I-2　業務要件の定義	直接	A	R	A	R	**C**
I-3　解決策の検討（システム化の方針、既存システムとの整合）	**IT 関連**	A	R	A	**C**	**R**
I-4　ベンダー情報の収集・見積の取得	**IT 関連**	A	R	A	**C**	**R**
I-5　投資効果と費用の算定（ BU は効果、 SO は費用）	**IT 関連**	A	R	A	R	**R**
I-6　予算要求・投資申請の作成	**IT 関連**	A	R	A	**C**	**R**
I-7　投資の決裁	—	A	R	**決裁者（新しい IT ガバナンス〈 Tier 〉で検討中）**		
I-8　ベンダーの選定	**IT 関連**	A	R	A	**C**	**R**
I-9　契約の締結	間接	A	R	**I**		**A/R**
I-10　発注・検収・支払いの手続き	間接	A	R			**A/R**
I-11　プロジェクトの推進（進捗・品質）	**IT 関連**	A	R	A	R	**R**
I-12　受け入れ（業務要件を満たすか）	直接	A	R	A	R	**C**
I-13　効果の確認（事後評価）	**IT 関連**	A	R	A	R	**C**

- Before： ビジネス側が単独で行っている状態（初版は 1 パターン）。実際の Before が違う案件は、書き直してから比べる
- After： IT 部門が関与を強め、直接業務と IT 関連業務の A はビジネスオーナーに残す。色付きのマスは Before から変わるところ（空欄は関与しなくなる）
- 案件ごとのカスタマイズ：変えられるのは IT 関連の行の BU と SO の R / C の持ち方と、 SO が R を担い始める時期だけ。 A の列と、直接・間接の行は変えない

RACI： 経費プロセス（ Before → After ）

BO： ビジネスオーナー（部門長）　BU： 部門担当　SO： システムオーナー（ IT 部門）　R： 実行　A： 最終責任　C： 相談　I： 連絡

活動	層	Before （現状）		After （移管後）		
		BO	BU	BO	BU	SO
E-1　システムを使った業務	直接	A	R	A	R	
E-2　部門で行う運用（ユーザー・権限の管理）	直接	A	R	A	R	**C**
E-3　予算の計上・執行の管理	間接	A	R	**I**		**A/R**
E-4　契約の更新・変更・解約の手続き	間接	A	R	**C**		**A/R**
E-5　請求書の受領・支払い	間接	A	R			**A/R**
E-6　委託先への指示・報告の受領（契約上の管理）	間接	A	R			**A/R**
E-7　運用状況のモニタリング（ SLA ・障害・利用状況）	**IT 関連**	A	R	A	**C**	**R**
E-8　改善活動（ BU は要望、 SO は整理と実施）	**IT 関連**	A	R	A	R	**R**
E-9　契約の見直しに向けた活動（利用実態・ライセンス数・代替案の評価、更新の判断）	**IT 関連**	A	R	A	**C**	**R**
E-10　ベンダーの評価	**IT 関連**	A	R	A	**C**	**R**
E-11　GxP の変更管理	**IT 関連**	A	R	A	R	**R**

- Before： ビジネス側が単独で行っている状態（初版は 1 パターン）。実際の Before が違う案件は、書き直してから比べる
- After： IT 部門が関与を強め、直接業務と IT 関連業務の A はビジネスオーナーに残す。色付きのマスは Before から変わるところ（空欄は関与しなくなる）
- 案件ごとのカスタマイズ: 変えられるのは IT 関連の行の BU と SO の R / C の持ち方と、 SO が R を担い始める時期だけ。 A の列と、直接・間接の行は変えない
- E-11 には、本来は品質保証部門の関与が要る（この表では省いている）

提言： IT 予算は「分けて」持つ

「事業側か、 IT 部門側か」の二択にしない。お金・契約・事務は IT 部門に、業務の最終責任（ A ）は事業側に置く。そのための 4 つの条件

①　予算と責任を分ける理由

お金の流れは IT 部門に集め、業務の判断は事業側に残す

- IT 部門に集めるのは予算・契約・間接業務。全社共通の基盤への影響の統制、ベンダーとの交渉力、重複の排除、 IT 費用の全社での可視化のため
- 業務アプリケーションの要否・要件・受け入れは、業務を知る側にしか判断できない。 A は事業側に残す（プロセスオーナー原則）
- 問うべきは「どちらが持つか」ではなく「何をどちらが持つか」

②　配分権の帰属

枠は全社で決め、枠の中の優先順位は事業側が決める

- 部門ごとの予算の枠と投資の決裁は、新しい IT ガバナンス（ Tier ）で決める
- 枠の中でどの案件を優先するかは、ビジネスオーナー（ BO ）が決める
- IT 部門（ SO ）は費用の妥当性と既存システムとの整合を評価し、異を唱える。合意できなければ Tier に上げる（ IT 部門が単独で止めない）

③　コスト意識の歯止め

払わなくなっても、使った費用は部門に見せる

- 移管した費用を、部門別・案件別に毎期示す（単価と内訳の開示）
- 削減した費用の一部を部門に返す（比率は未定）
- 配賦・チャージバックに進むかは、 1 年分の実績を見て判断する

④　中間層の移行期限

IT 関連業務の R は、期限を切って IT 部門に移す

- SO が R を持ち始める時期に上限を置く（例：次回の契約更新、遅くとも 2027 年度末）
- 上限を越えて Before のまま残す業務は、理由を合意文書に書き、進行役が横並びで確かめる
- 上限がないと、移るのは帳簿と事務だけになり、統制の目的を果たせない
