

IT予算移管 キックオフ

実務の進め方とお願いしたいこと

● 2026年10月1日 IT部門

本日の内容

移管を進めることは決定済みです。本日は実務の進め方をご説明します

1

決まっていること

移管の範囲と、移すかどうかの決め方

2

進め方とスケジュール

キックオフから予算編成への反映まで

3

お願いしたいこと

窓口の指名、予算シートの提出、ヒアリングへの対応

移管の範囲

予算・契約・業務の3つを、IT部門へ移します

予算

システムに関する
費用の予算

移管した予算は
IT部門の予算になる

契約

システムの利用・保守・
開発などの契約

契約名義と支払いを
IT部門へ移す

業務


システムの運用・開発、
委託先や契約の管理

業務の担い手を
IT部門へ移す

- **初年度に全部は移しません** 部門ごとに協議し、年単位のロードマップで段階的に移します
- **移管直後はやり方を変えません** 運用の見直しは、移管が安定してから行います
- **不要なものは移管に合わせて見直します** 使われていない契約などは、この機会に削減します

予算・システム・業務・契約のつながり


予算シート of 案件を起点に、関係するシステム・業務・契約をたどって整理します

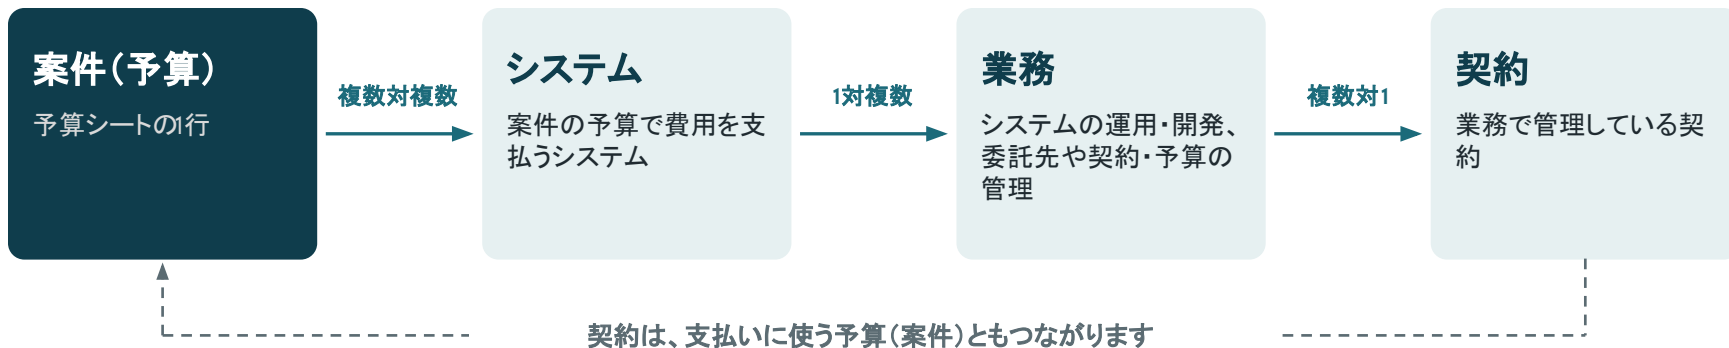

- ・ 予算シート of 案件を起点に、システム → 業務 → 契約の順に確認します (ヒアリングもこの順で伺います)
- ・ 1つの案件に複数のシステムが、1つのシステムに複数の案件が紐付くことがあります
- ・ システムと関係のない業務・契約は、移管の対象になりません (例: 書籍や情報サービスの購読)

移管の決め方

システムから順に決め、業務・契約・予算はその結果に従います

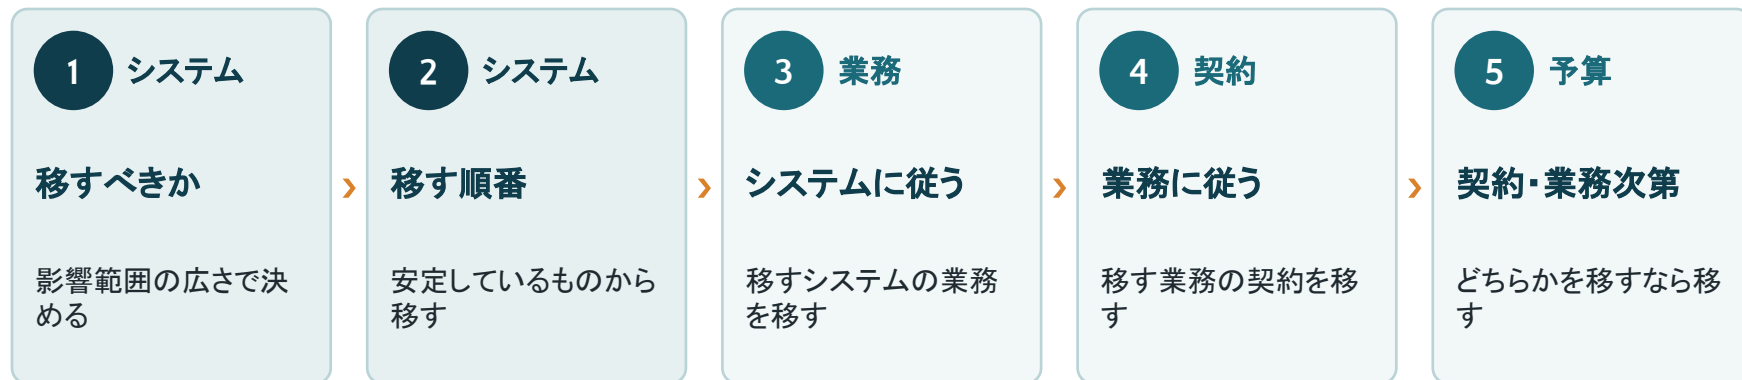

移すかどうかは、影響範囲の広さだけで決めます。

移しにくいことを理由に「移さない」とはせず、準備を整えてから2年目以降に移します。

移す順番は安定性(文書・管理者の有無、規制の手続き)で決め、安定したものから初年度に移します。

判定の基準は全部門共通です。

影響範囲の見方と、今回留保とするもの

3つの質問で、システムの影響がどこまで及ぶかを見ます

影響範囲の 3つの質問

狭い → 広い

1 誰が使っているか	自部門だけ	他部門も	全社・社外も
2 データを誰が使っているか	自部門だけ	他部門・ 他システムも	全社・社外も
3 どこで動いているか	自部門専用	共用環境の 一部	全社共用の 基盤そのもの

1つでも自部門の外に及べば、移管の対象になります

今回、留保とするもの

自部門の中で閉じているシステム


来年度から導入予定の新しいITガバナンス体制（検討中）では、自部門に閉じたシステムは、説明責任（アカウントビリティ）も部門に置く運用を想定しています。

この段階でIT部門へ移管すると、説明責任は部門、予算と運用はIT部門という「逆ねじれ」が生じます。

そのため今回は留保とし、体制の確定にあわせて改めて判断します。

進め方とスケジュール(案)

日程は予算編成の締め切りに合わせて確定し、改めてご案内します

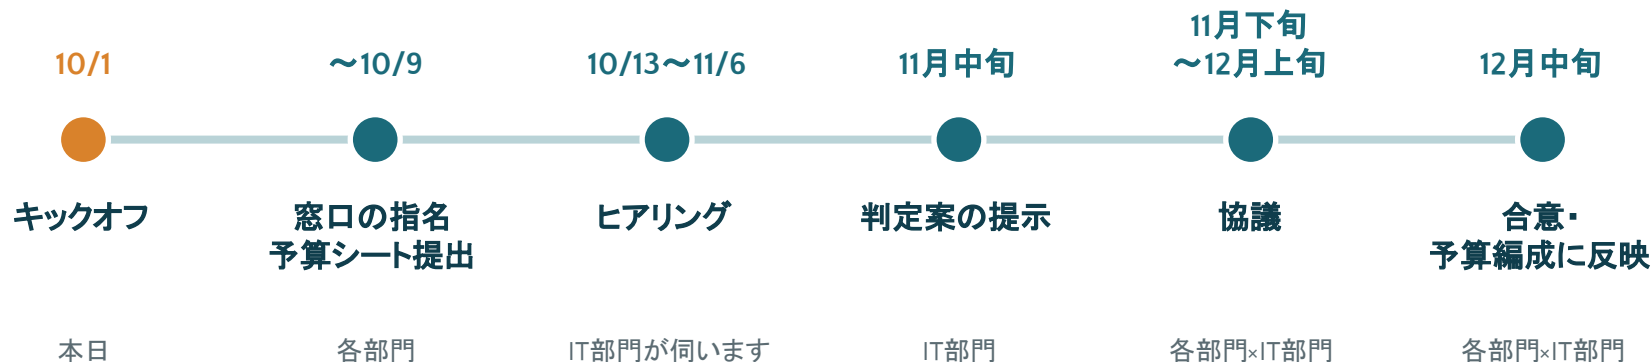

ヒアリングで伺った内容はIT部門が整理し、判定案としてお示しします。各部門には内容の確認と、協議への参加をお願いします。

お願いしたいこと

記入の大半はIT部門が行います。各部門には情報のご提供と確認をお願いします

1

窓口担当者の指名

部門ごとに1名。ヒアリングと協議の窓口になります

10/9まで

2

予算シートの提出

今年度実績(見込みを含む)と来年度予算の案件一覧

10/9まで

3

ヒアリングへの対応

1回60分程度。システムの数に応じて1~2回を想定しています

10/13~11/6

4

移管の希望と理由

案件ごとに、予算・契約・業務を移したいか、その理由をお聞きます

ヒアリング時

ヒアリングで伺う内容

わかる範囲でお答えください。わからない項目は一緒に確認します

システム

- ・ 誰が使っているか
- ・ データを誰が使っているか
- ・ どこで動いているか
- ・ 設計書・手順書がそろっているか
- ・ 内容を判断できる管理者がいるか
- ・ GxP対象か、個人情報扱うか

業務

- ・ システムに関する業務(運用・開発、委託先の管理、契約・予算の管理)
- ・ 実施者、頻度、年間工数
- ・ 部門としての関わり方
- ・ SOPの有無

契約

- ・ 契約名、相手先、契約の種類
- ・ 契約期間、自動更新、解約予告
- ・ 年間金額
- ・ どの業務で管理しているか

事前にご用意いただきたい資料 契約書(写し)、システム構成図・設計書、運用手順書SOP、委託先からの報告書(手元にあるものだけで結構です)

問い合わせ先とよくある質問

問い合わせ先

IT部門 予算移管担当

担当者: (氏名を記入)

メール: (アドレスを記入)

- Q ヒアリングの前に何を準備すればよいですか**
前のページの資料です。手元にはないものは用意しなくて結構です
- Q 見送り(留保)になったシステムはどうなりますか**
今回は各部門に残します。翌年度以降に改めて判断します
- Q 部門の希望と判定案が違ったらどうなりますか**
協議の場で、判定の理由をご説明します。基準は全部門共通です
- Q 移管後、変更の依頼はどこに出せばよいですか**
移管の前に、依頼の窓口と手順を改めてご案内します

想定される質問と回答

Q 一部だけ移すことはありますか

案件・契約の中に移すものと移さないものがある場合は「一部移管」とし、契約の分割や費用の按分を協議します

Q 解約予告の期限が早い契約は

合意(12月中旬)より前に通知期限が来る契約があります。予算シートのご提出時に満了日と解約予告期間をお知らせください。先行してご相談します

Q 事業部門にとっての利点は何ですか

費用が自部門の予算から外れ、契約・更改の手間がなくなります。共有基盤の規制対応はIT部門が担います

Q IT部門は何を約束しますか

変更依頼への回答期限を設け、移管前にお示しします。移管直後は運用を据え置きます

Q 削減した分の予算はどうなりますか

扱いは、部門ごとの協議で決めます

Q 部門の希望はどう扱われますか

移すかどうかは共通の基準で決めます。ご希望は、移管の時期と進め方(引継ぎ方法など)に反映します

Q 業務の担当者はどうなりますか

人員の異動は前提としていません。自ら運用・開発している業務など、人と切り離せない場合は個別にご相談します

Q 「安定性」は何に使うのですか

移す順番に使います。安定しているものは初年度、それ以外は準備を整えて年目以降に移します。移すかどうかは変わりません

Q 新しいITガバナンス体制とは

現在検討中です。内容が固まりしだい、改めてご案内します
